



السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي
بلدية بني سهيلا

الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا

إعداد
فريق التخطيط الأساسي

إشراف
الاستشاري/ الرؤية الشاملة للهندسة والإدارة



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للهندسة والإدارة

تمويل/ صندوق تطوير وإقراض البلديات



مايو، 2018
فلسطين

للأعوام
2021-2018



المحتويات

5	تحقيق شرعية الخطة:	1.
5	تبني و إقرار المجلس البلدي للخطة:	1.1
6	توقيع العقد المجتمعي:	1.2
12	تقديم رئيس البلدية:	2.
13	الملخص التنفيذي:	3.
14	مقدمة	4.
15	منهجية اعداد الخطة	4.1.
17	هيكل ادارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي:	4.2.
18	قوائم تشكيل اللجان:	4.3.
22	نبذة عن مدينة بني سهيلا:	5.
22	تاريخ مدينة بني سهيلا:	5.1
22	الخصائص الجغرافية:	5.2
22	الموقع :	5.2.1
23	المساحة والتضاريس:	5.2.2
24	التربة :	5.2.3
24	المناخ :	5.2.4
24	الموارد المائية :	5.2.5
25	الخصائص الديموغرافية لبني سهيلا:	5.3
25	السكان :	5.3.1
25	التوزيع الجغرافي للسكان :	5.3.2
26	الرؤية والتوجهات التنموية	6.
26	الرؤية	6.1.
26	القضايا التنموية ذات الاولوية	6.2.
27	الإطار التنموي	6.3
39	خط التنفيذ والمتابعة والتقييم	7.

39 خطة التنفيذ الرباعية	.7.1
68 خطة التنفيذ السنوية	.7.2
75 خطة المتابعة والتقييم	.7.3
96 الملاحق	.8
96 التقرير التشخيصي	8.1.
96 توصيف مكونات البرامج/مشاريع السنة الأولى	8.2.

1. تحقيق شرعية الخطة:

1.1. تبني و إقرار المجلس البلدي للخطة:



بلدية بني سهيلا
Municipality of Bani - Suhaila

دولة فلسطين
State of Palestine
وزارة الحكم المحلي
Ministry of Local Government

قرار مجلس بلدي

رقم (39 / 2018)

قرر المجلس البلدي في جلسته رقم (2018/16) و المنعقدة بتاريخ : 2018 /04/29 .

- وبعد دراسة الخطة التنموية ومناقشتها التالي :
- المصادقة على الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا للأعوام (2018-2024) على أن تقوم الجهات المختصة في البلدية بعمل كافة الاجراءات اللازمة حسب الأصول .

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس البلدية	أ. حماد محمود الرقب	
نائب رئيس البلدية	أ. مازن اعبيد النجار	
الأعضاء	م . عاطف محمد ابو العلا	
	د . ربحي سليمان بركة	
	د . موسى ابراهيم ابو دقة	
	م.موسى أحمد القرا	
	أ . ابراهيم العبد سمور	
	أ سعيد حمدان ابو جامع	
	أ . حامد محمد ابو سعادة	
	أ . سعد محمد ابو جامع	
أ . خولة ابو خديجة		

بني سهيلا - خان يونس قطاع غزة فلسطين
Beni - Suhaila, Khan Younis, Gaza Strip, Palestine

هاتف: +972(8)2071088
فاكس: 0972(8)2071077
www.Suh1.com
Info@Suh1.com
Fb.com/Suh1.com



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

حياة أفضل



Municipality of Beni-Suef



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للمهندسة والإدارة

العقد المجتمعي

تحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا تتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
أحمد محمد رجب الله أبو كرك			
عبدالله بن بشار أبو بوشة			
د. محمد بن أيوب دة	جامعة الأقصر		
د. سفيان أبو بوشة	الأزهر / مصر		
محمد نظام أبو جوامع	الجمعية الشبابية		
احمد محمد احمد منيار	الجمعية الشبابية		
ابراهيم محمد أبو حجاج			
علاء بلال أبو كرك			
طلحة محمد مصطفى	مركز الدراسات		
عمر سامي البرشم	بلدية بني سهيلا		
أحمد عبد الفتوح	بلدية بني سهيلا		
محمد البريم	بلدية بني سهيلا		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

حياة أفضل



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للمهندسة والاداره

العقد المجتمعي

نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
دنيا العبدوي	جمعية انقاذ المستقبل		
أيمن خالد العبدوي	-		
إسراء البراهيم الكعوي	مشروع بيتنا		
هشام محمد عروة	مركز تنمية الشباب		
عبدالله صالح الشاذلي	شركة الاتصالات		
رواد والد الشاذلي	المجالس الشبابية		
إيمانة زيل	المجالس الشبابية		
غادة خلعة ابوجامع	المجالس الشبابية		
عم اسامة محمد الفخار	الاشغال والأفكار		
سارة اسامة الفخار	بلدية بني سهيلا		
محمد عبد الرحمن محمد علا	منظمة شباب/الهندسة للادارة والتطوير		
عمر حسنة التوريدة			



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

لحياة أفضل



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للمهندسة والإدارة

العقد المجتمعي

تحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
محمد بن جوارك	مختار		
د. فهد بن محمد بن محمد	مجلس بلديات الشمال الغربي		
خوري بن محمد بن محمد بن جوارك	الداخلية		
هوسنا عبد الحميد بن يوسف	الهيئة		
مصطفى محمد مصطفى أبو حطاي	عضو كبار اصحاب		
محمد بن عبد الرحمن	اتحاد بلديات		
ابراهيم ارحب	بلدية بن مينا		
سليم محمد بن ابراهيم	بلدية بن مينا		
كمال مصطفى العز	بلدية بن مينا		
أحمد مصطفى بكر أبو بكر	بلدية بن مينا		
عبد الله بن محمد بن جوارك	بلدية بن مينا		
أكرم بن محمد بن جوارك	وزارة الداخلية		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

لحياة أفضل



العقد المجتمعي

نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
دنيا أحمد حرمين المني	بلدية بني سهيلا		
أنسار خالد محمود العمري	بلدية بني سهيلا		
إسماعيل إبراهيم القوي	بلدية بني سهيلا		
شيماء محمد محمد	بلدية بني سهيلا		
زوراد النجار	~		
عبدالله صالح الشافعي	~		
اياد نبيل أبو بركة	بلدية بني سهيلا		
غادة خالد أبو خمار	بلدية بني سهيلا		
عصر اسامة محمد النجار	~		
سارة اسامة محمد النجار	~		
شيماء محمد محمد	بلدية بني سهيلا		
عمر حسين أبو صيدة	بلدية بني سهيلا		
محمد عبيد محمد محمد	بلدية بني سهيلا		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

حياة أفضل



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للهندسة والادارة

العقد المجتمعي

تحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأنا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الختم الرسمي	التوقيع	المؤسسة	الاسم
		الجمهورية العربية السورية	العميد محمد أبو بكر
		مجلس بلديات	محمد عبد الرحمن القرنا
		بلدية بني سهيلا	محمود محمد علي أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	عبد الله محمد علي
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر
		بلدية بني سهيلا	محمد عبد الله أبو بكر



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund

لحياة أفضل



Global Vision Consultants
الرؤية الشاملة للمهندسة والإدارة

العقد المجتمعي

تحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة بني سهيلا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
زكي سليمان بكوة	المجلس البلدي		
محمد انداس البريم	التربية والتعليم		
علاء صلاح سليمان أبو صالح	الديم والتعلیم		
عبد محمد أحمد أبو عايد	وزارة الصحة		
محمد حاد علي أبو الهوان	بلدية بني سهيلا		
علاء محمد خالد أبو سعادة	المجلس البلدي		
سار يوسف أحمد أوليد	بلدية بني سهيلا		
يوسف أحمد محمد الوليد	بلدية بني سهيلا		
د. هاجر حسي أبو جلع	المركز الطبي		
محمد محمد الوصاف	مكتب أم ستادي		
يوسف خالد الشامي	تجمع		
إ.إ.إ. إسماعيل إسماعيل	موظف حكومي		
س. جمال شحاتة أبو مقسم	بلدية بني سهيلا		

2. تقديم رئيس البلدية:

تدرك بلدية بني سهيلا أهمية وجود خطة محلية تنموية مبنية على طموحات وآمال المجتمع والبلدية وقائمة على رؤى وحاجات وتطلعات المجتمع المحلي؛ وذلك بالتعاون مع شركائنا في التنمية من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي، كي نتمكن معاً من تحقيق التطور المطلوب للمنطقة.

وقد ظهر التكامل والتعاون بين سكان مدينة بني سهيلا من خلال العمل الدؤوب والمتواصل مع كل من شارك وساهم في بناء المراحل الثلاث للخطة التنموية المحلية لبناء مستقبل البلدة/المدينة للأعوام الأربعة (2018-2021) لما فيه خدمة للمواطن.

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لجميع أعضاء اللجان ذات العلاقة بإعداد الخطة، ولأعضاء ومستشاري المكتب الاستشاري للرؤية الشاملة للهندسة والإدارة، وللأخوة موظفي صندوق تطوير واقتراض البلديات الذين ساهموا في الوصول إلى هذه المرحلة الثالثة من اعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا.

علماً بأننا سنسعى جاهدين بكل الوسائل والجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة والبرامج والمشاريع المطروحة ضمن الخطة التنموية المحلية للبلدة/المدينة. وأننا نؤكد في بلدية بني سهيلا على استعداد دائم للعمل المخلص الدؤوب في جو من الشفافية والمسئولية والتعاون لوضع الخطة التنموية المحلية في شكلها النهائي.

وبالله التوفيق،،،

رئيس البلدية

حماد الرقب

3. الملخص التنفيذي:

لقد تم اعداد تقرير الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا للأعوام من 2018-2021 حسب إجراءات دليل التخطيط التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسطينية للعام 2017م ، والذي تم انجازه بالتظافر بين كل من وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير واقراض البلديات.

وهي تأتي ضمن المرحلة الثالثة للجهود المتواصلة لمدة أربع أشهر من العمل المتواصل والدؤوب لإنجاز هذا تقرير الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا ؛ وذلك بمساندة ومساعدة أعضاء فريق المكتب الاستشاري الرؤية الشاملة للهندسة والإدارة، وبالمشاركة الفعالة من رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وموظفي البلدية، والجهات المتخصصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب العلاقة، واللجان التنموية.

ولقد هدف مشروع اعداد الخطة التنموية المحلية إلى تحقيق ما يلي:

- تعزيز مبدأ المشاركة من حيث التركيز على مشاركة المواطنين، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص، وجميع ذو الشأن في تحديد القضايا والأولويات التنموية، وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
- تعزيز مبدأ الشفافية، والمساءلة من حيث دعم مشاركة المواطنين، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص، وجميع ذو الشأن في تخطيط، وتنفيذ النشاطات التنموية، وتبوء مكانة بارزة في متابعة وتقويم الانجازات وتحقيق الاهداف المرجوة.
- تعزيز مبدأ التكاملية من حيث التطرق للقضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ومن حيث التكاملية مع خطط المستويات الادارية المختلفة، والتخطيط الفيزيائي/الهيكلي، وموازنات الهيئات المحلية.
- التركيز على القضايا ذات الاولوية مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد، والفرص المتاحة، والمعوقات المحتملة.

ولقد تلخصت أهداف وجود خطة تنمية محلية لمدينة بني سهيلا بالتالي:

- تشخيص الوضع الراهن للمجالات التنموية الرئيسية والفرعية.
- إعداد رؤية تنموية تعبر عن تطلعات، وأحلام المواطنين ضمن اطار زمنى لمدة (16عام).
- تطوير، وتوثيق السياسات التنموية الرئيسية نحو مختلف القضايا ذات الأولوية.
- تحديد الأهداف، وترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ؛ وذلك بالمشاركة مع مؤسسات أفراد المجتمع المدني.
- تعزيز، وتطبيق مفاهيم الحكم، والإدارة الرشيدة مما يحقق المشاركة المجتمعية، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والعدالة للجميع .
- اختيار برامج ومشاريع تنموية تعبر عن أولويات المجتمع المحلي، وتتسم بالعدالة في التوزيع .

- وضع خطة تنفيذ رباعية، وسنوية للسنة الأولى، واضحة وموثقة وضمن اطار زمنى معلوم وتقديرات دقيقة.
- اختيار وتحديد منهجية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع، وقياس نجاحها أو فشلها.

ولقد تلخصت استنتاجات تقرير اعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا بتحديد الرؤية للأعوام الأربعة المقبلة 2018-2021، وكذلك بتحديد القضايا التنموية ذات الأولوية للمحاور التنموية الرئيسية الأربعة (البيئة والبنى التحتية، التنمية الاجتماعية، تنمية الاقتصاد المحلي، الإدارة والحكم الرشيد)؛ حيث تم تحديد أولويات (13) قضايا تنموية لمدينة بني سهيلا على أن تغطى هذه الأولويات من خلال رزمة من البرامج والمشاريع التي ستنفذ على مدار الأربع الأعوام القادمة، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ(32737000 دولار).

4. مقدمة

إن التخطيط التنموي المحلي هو منهج علمي يُستخدم لبلورة الأولويات والأهداف التنموية للتجمعات السكانية، وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان، والأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة.


وتتبع أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم، والإدارة الرشيدة، والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر، والرقى والنهوض؛ وذلك بالاعتماد على موارده ومقوماته الذاتية.

ولقد تم اعداد تقرير الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا بناءً على اجراءات إجراءات دليل التخطيط التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسطينية للعام 2017م؛ وذلك باعتبارها الخطوة الأخيرة من المرحلة الثالثة، وذلك بهدف توثيق مخرجات عملية التخطيط في تقرير الخطة التنموية المحلية للمدينة/البلدة.

حيث يرسم التقرير الحالي الخطة التنموية المحلية التي ستوجه لتطوير لمدينة بني سهيلا على مدى الأربع سنوات القادمة (2018-2021) في مجالات التنموية الرئيسية الأربعة (البيئة والبنى التحتية، تنمية الاقتصاد المحلي، التنمية الاجتماعية، الإدارة والحكم الرشيد).

4.1. منهجية إعداد الخطة

ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة بني سهيلا على مجموعة من المراحل، والأنشطة بالاستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي للبلدات والمدن الفلسطينية للعام 2017م. ولقد تمثلت المراحل بالحلقة الدائرية المدرجة أدناه مقسمة إلى خمسة مراحل؛ حيث تشمل كل مرحلة على مجموعة من الخطوات، وكل خطوة تشمل عدة أنشطة.

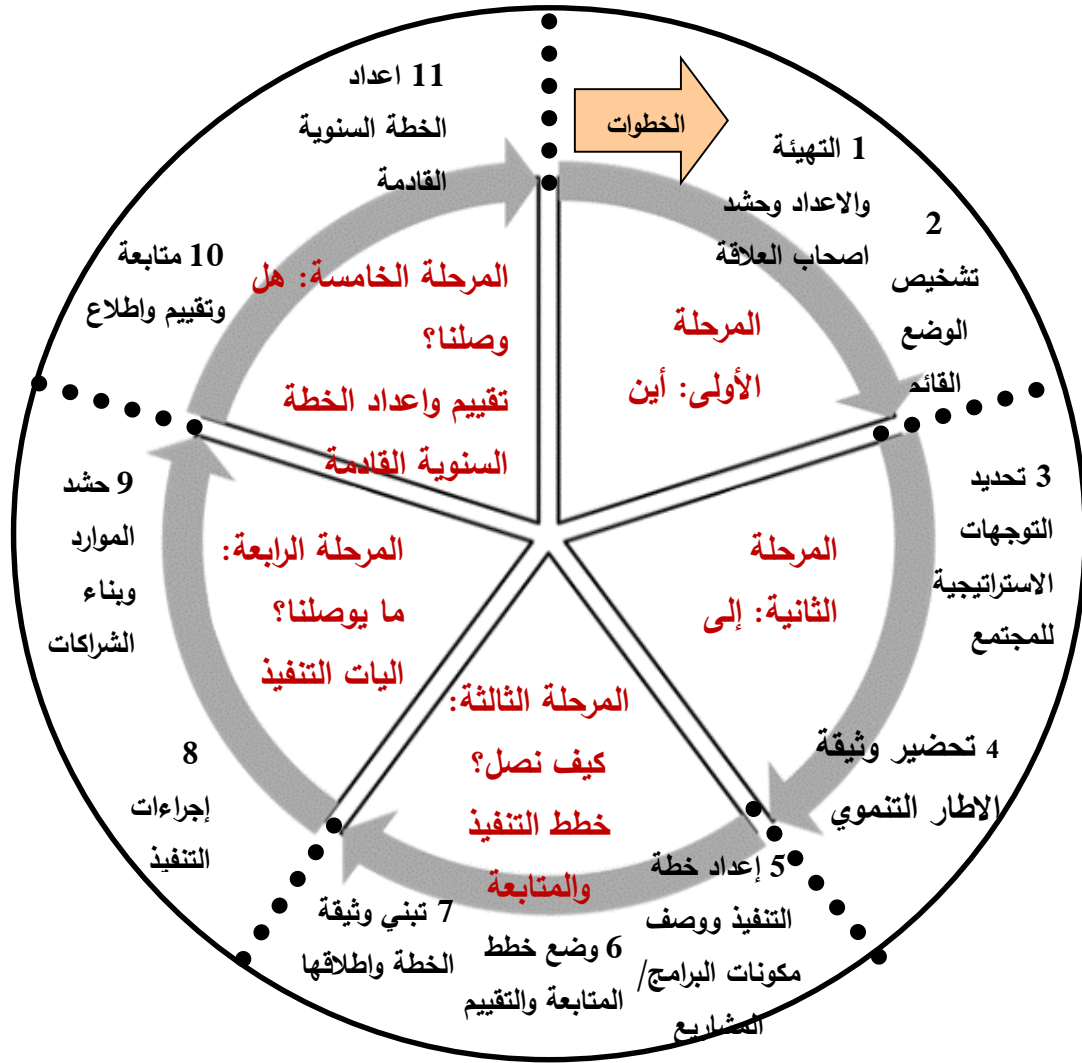

علماً بأنه قد تم تطبيق الثلاث مراحل الأولى من المنهجية الموضحة أعلاه بمشاركة مجتمعية واسعة من خلال عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات؛ حيث كان هناك مشاركة لممثلي المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة. ولقد تمثلت الأجزاء الثلاث التي تم إنجازها حسب التالي:

المرحلة الأولى: أين نحن الآن؟ (التنظيم والتحليل):

خطوة التهيئة والإعداد، وحشد أصحاب العلاقة:

- توجيه الهيئة المحلية والمؤسسات المجتمعية
- إجراء الترتيبات المؤسسية اللازمة من: (تشكيل فريق التخطيط الأساسي، تشكيل لجنة التخطيط التنموي المحلي، تشكيل نواة فريق التخطيط الأساسي، تشكيل نواة لجان المجالات التنموية، وحصر قائمة اصحاب العلاقة الاولية -تشكيل لجنة المجالات التنموية، واعداد خطة التنفيذ وهيكلية عملية التخطيط).

- عقد لقاء البيت المفتوح الاول لإطلاق عملية اعداد الخطة (اللقاء المجتمعي الأول)

- استكمال تشكيل فريق التخطيط واللجان الاخرى (تشكيل لجنة المجالات التنموية)

خطوة تشخيص الوضع القائم:

- جمع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة (دليل التجمع السكاني)
- تشخيص المجالات التنموية
- تحضير التقرير التشخيصي.

المرحلة الثانية: أين نريد أن نتجه؟ (الإطار التنموي):

خطوة تحديد التوجهات الاستراتيجية للمجتمع:

- تحديد الرؤية والقضايا ذات الاولوية والاهداف (عقد ورشة العمل الاولى)، وتشمل: (تحديد الرؤية التنموية، تحديد القضايا ذات الاولوية للتجمع السكاني، تحديد الاهداف التنموية).
- صياغة البرامج التنموية

خطوة تحضير وثيقة الإطار التنموي:

- التشاور مع شركاء البرامج
- صياغة الاطار التنموي والافصاح عنه

المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ (خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم):

خطوة اعداد خطة التنفيذ ووصف مكونات البرامج/ المشاريع:

- اعداد الخطة الرباعية: (تصنيف مكونات البرامج/المشاريع المقترحة، اعداد الخطة الرباعية)
- اعداد خطة السنة الاولى

- توصيف مكونات برامج/مشاريع السنة الاولى (وربطها مكانيا وماليا): (توصيف مكونات برامج/مشاريع خطة السنة الاولى وربطها ماليا، ربط مكونات برامج/مشاريع خطة السنة الاولى مكانيا).
- مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية ووثائق مكونات البرامج/المشاريع المقترحة للسنة الاولى وتحديدها بشكل نهائي (عقد ورشة العمل الثانية)


خطوة وضع خطة المتابعة والتقييم:

- تحضير خطة المتابعة والتقييم.

خطوة تبني الخطة، وإطلاقها:

- تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية: (تحضير مسودة الخطة، تبني الخطة من مجلس الهيئة المحلية)
- عقد لقاء البيت المفتوح الثاني لإطلاق الخطة (اللقاء المجتمعي الثاني): عقد لقاء البيت المفتوح لإطلاق الخطة (اللقاء المجتمعي الثاني)، توقيع الوثيقة المجتمعية.

4.2. هيكل ادارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي:

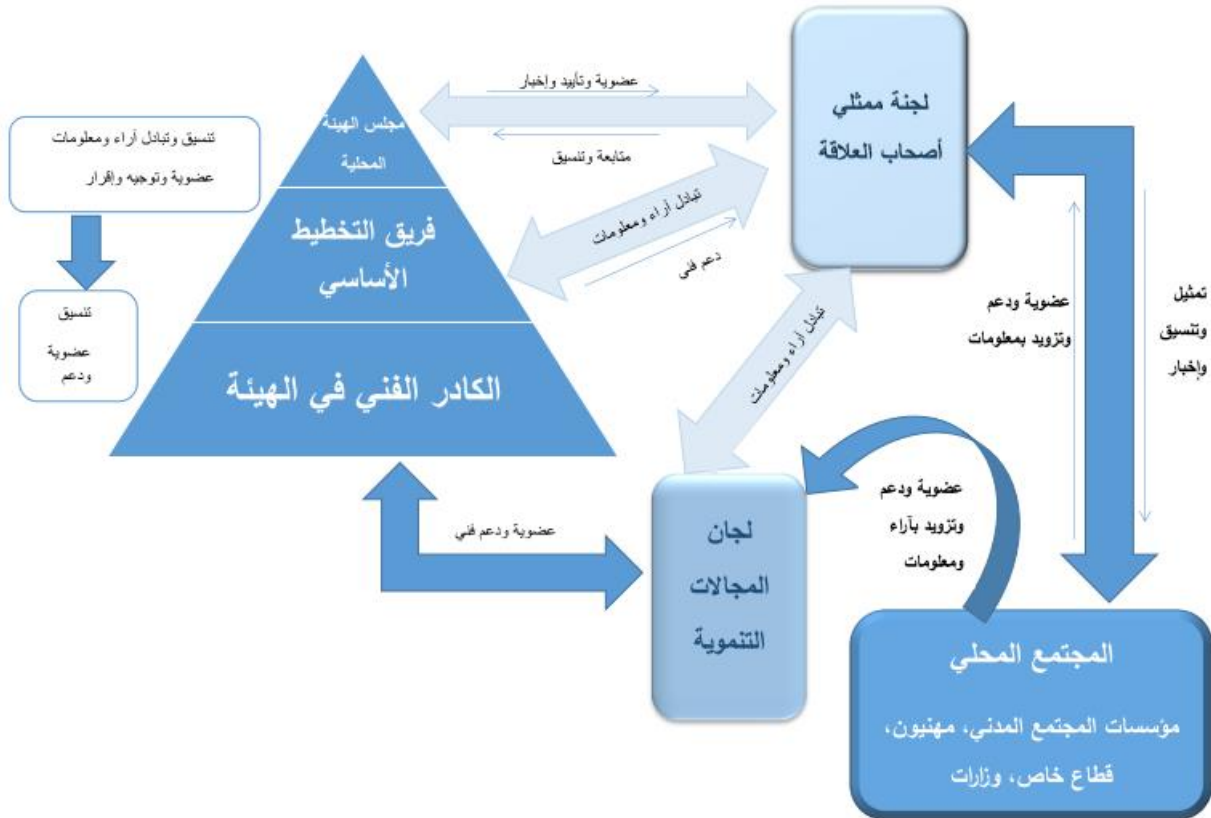

4.3. قوائم تشكيل اللجان:

لجنة التخطيط التنموي المحلي

اسم العضو	دوره في اللجنة (مقرر أو عضو)	مجال التخصص
1. أ. حماد محمود الرقب	رئيس الفريق	رئيس بلدية بني سهيلا
2. أ. مازن النجار	عضو	نائب رئيس البلدية
3. أ.د. موسى أبو دقة	عضو	عضو مجلس بلدي
4. م. موسى القرا	عضو	عضو مجلس بلدي
5. رائد العبد أبو ريذة	عضو	مدير عام البلدية

فريق التخطيط الأساسي

العمر	الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام	المؤسسة التي يعمل بها	دوره في الفريق	اسم العضوة	فوق	تحت
							30	30
*	M	رئيس قسم	مشاريع	بلدية بني سهيلا	مقرر	1. م. محمد البريم		
*	M	مسؤول العلاقات الدولية	العلاقات العامة	المجلس التشريعي	رئيساً	2. أ. إبراهيم سمور		
*	F	منسقة مشاريع	تسويق المشاريع	بلدية بني سهيلا	منسقة التخطيط	3. م. صفاء الغنام		
*	M	مهندس مشاريع	مشاريع	بلدية بني سهيلا	عضو	4. م. عمر أبو ريذة		
	M	مهندس صيانة وأشغال	مشاريع	بلدية بني سهيلا	عضو	5. م. محمد كلاب	*	
*	M	رئيس قسم	تخطيط	بلدية بني سهيلا	عضو	6. تيسر محمد الرقب		
*	M	رئيس قسم	صحة وبيئة	بلدية بني سهيلا	عضو	7. م. موسى أبو جامع		
*	M	رئيس قسم	محاسب	بلدية بني سهيلا	عضو	8. جمال سلامة سليمان الفرا		
*	M	مدير فني	مهندس	وزارة التربية والتعليم	عضو	9. م. جهاد محمود صقر		
*	M	رئيس قسم	الأمن	الشرطة	عضو	10. طلعت محمد عصفور		
*	F	تصميم هندسي	مهندسة	خاص	عضو	11. م. غدير أبو دقة		
*	M	متقاعد	معلم	الإصلاح	عضو	12. أ. كمال سلام أبو خاطر		
*	M	مدير مكتب هندسي	مهندس	خاص	عضو	13. م. حسين أبو جامع		
	M	مدير دائرة	إدارة	وزارة الداخلية	عضو	14. أكرم حسن أبو عاصي	*	
*	M	مدير مستوصف	الصحة والبيئة	وزارة الصحة	عضو	15. د. وائل الرقب		
	M	مكتب محاماة	محامي	خاص	عضو	16. أحمد صلاح سمور	*	
	M	-	الاقتصاد	خاص	عضو	17. وائل عبد الهادي أبو سلوت	*	

اللجان التنموية / لجنة الإدارة والحكم الرشيد

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
تحت 30	فوق 30					
*		M	رئيس قسم التنظيم	الإدارة	بلدية بني سهيلا	1. م. تيسير الرقب
	*	M	مبرمج تطبيقات انترنت	تكنولوجيا معلومات	وزارة الاتصالات	2. حامد محمد أبو سعادة
*		M	متقاعد	الإدارة	التأمين والمعاشات	3. محمد رزق أبو ريده
	*	M	محاسب	إدارة	بلدية بني سهيلا	4. حسان عبد الرؤوف عصفور
*		M	مدير نقابة المهندسين - فرع غزة	هندسة حاسوب	نقابة المهندسين	5. إسماعيل ناجي الفجم
*		M	عميد كلية التكنولوجيا	تكنولوجيا المعلومات	الجامعة الإسلامية	6. د. رحي سليمان بركة
*		F	منسقة مشاريع	هندسة مدنية	بلدية بني سهيلا	7. صفاء نادر الغنام

اللجان التنموية / لجنة البيئة والبنى التحتية

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
فوق 30	تحت 30					
*		M	مهندس المشاريع	منسق اللجنة	بلدية بني سهيلا	1. م. عمر أبو ريده
*		M	رئيس شعبة الحسابات	محاسبة	بلدية بني سهيلا	2. م. موسى أحمد القرا
	*	M		مهندس مدني	بلدية بني سهيلا	3. م. محمد عبد الحي كلاب
*		M	مدير في وزارة أوقاف	تربية	وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية	4. مازن عبيد النجار
	*	F	-	تربية-لغة إنجليزية	المجلس الشبابي	5. غادة طلعت أبو جامع
	*	F	معلم	تعليم مرحلة أساسية	المجلس الشبابي	6. نداء وائل النجار
	*	F	ممرضة	تمريض	المجلس الشبابي	7. إيمان نبيل بركة

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
فوق 30	تحت 30					
	*	F	متطوعة	أخصائي نفسي	المجلس الشبابي	8. أنسام خالد القهوجي
*		M	مدير نقابة المهندسين - فرع الجنوب	مهندس كمبيوتر	مدير نقابة المهندسين	9. إسماعيل ناجي الفجم
*		M	مساح	مساحة	خاص	10. يوسف حمد سلمان أبو لبددة
*		M	مهندس	مقاولات	شركة خاصة	11. محمد سامي أبو سبت
*		M	رئيس قسم	إدارة	بلدية بني سهيلا	12. ياسر أبو العلا
	*	M	تطوع	الطرق	المجلس الشبابي	13. إبراهيم محمد أبو هجرس
	*	F	مندوب مبيعات	تواصل	الاتصالات الفلسطينية	14. رواء وائل النجار

اللجان التنموية / لجنة التنمية الاجتماعية

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
فوق 30	تحت 30					
*		M	رئيس قسم الصحة	منسق اللجنة	بلدية بني سهيلا	1. م. موسى أبو جامع
*		M	مهندس	مهندس	وزارة التربية و التعليم	2. جهاد محمد محمود صقر
*		M	معلم	التعليم	وزارة التربية و التعليم	3. سعيد حمدان أحمد أبو جامع
*		M	مفتش صحة	أحياء دقيقة	بلدية بني سهيلا	4. عمر سامي البريم
	*	M	متطوع	الصحة	المجلس الشبابي	5. محمد نظام أبو جامع
*		M	مدير مركز الشهداء	الصحة	وزارة الصحة	6. د. وائل عبد الحميد الرقب
	*	M	متطوع	العمل الاجتماعي	طالب جامعي	7. أحمد محمد عبد أحمد النجار
*		M	معلم	التعليم	وزارة التربية و التعليم	8. حمدان أسعد حمدان البريم
	*	M	موظف	العمل الاجتماعي	رئيس المجلس الشبابي	9. عمرو عاطف الفجم
	*	M	متطوع	العمل الاجتماعي	المجلس الشبابي	10. عدي فضل أبو طعيمة
	*	M	متطوع	العمل الاجتماعي	المجلس الشبابي	11. مؤنس جبر أحمد أبو شهلا

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
فوق 30	تحت 30					
	*	M	متطوع	العمل الاجتماعي	المجلس الشبابي	12. لؤي كمال عبد الهادي أبو سلوت
*		M	مدير المركز	العمل الاجتماعي	مركز شبابي	13. عبد الله صالح الشافعي
	*	F	متطوعة	ارشاد و تثقيف صحي	خريجة	14. دنيا أحمد مرضي المدني
*		F	عضو مجلس بلدي	التعليم	وزارة التربية و التعليم سابقاً	15. أ.خولة أبو جامع

اللجان التنموية / لجنة تنمية الاقتصاد المحلي

العمر		الجنس	المسمى الوظيفي	مجال الاهتمام/التخصص	المؤسسة التي يعمل بها	اسم العضو
فوق 30	تحت 30					
*		M	مسؤول العلاقات الدولية	العلاقات العامة	المجلس التشريعي	1. ابراهيم سمور
*		M	المستشار القانوني	قانوني	بلدية بني سهيلا	2. علاء رضوان
*		M	مدير مجلس البحث	البحث العلمي	وزارة التربية و التعليم	3. جابر حسين أبو جامع
	*	F	إعلامية	التثقيف	جمعية الثقافة و الفكر	4. سارة أسامة النجار
*		M	مدير دائرة الأضرار	الزراعة	وزارة الزراعة	5. هشام عوض أبو عابد
*		M	مدير	المالية	وزارة المالية	6. أكرم محمود أبو عليان
*		M	مدرس	التعليم	تعليم	7. خليل محمد أبو سبت
	*	M	متطوع	السياحة	الجامعة	8. عمر أسامة النجار
*		M	مدير المعابر	الاقتصاد	وزارة الإقتصاد	9. حمدان عبد الحي أبو رضوان
*		M	مستشار قانوني	القانون	وزارة الأوقاف	10. رمزي صالح الشافعي
*		F	رئيس قسم	الادارة	وزارة الداخلية	11. وداد سلمان أبو جامع

5. نبذة عن مدينة بني سهيلا:

5.1. تاريخ مدينة بني سهيلا:

أنشأت هذه البلدة قبيلة بني سهيل العربية التي نزلت هذه الديار وأقيمت على مرتفع من الأرض يعلو 75 متر عن سطح البحر ازدادت المساحة العمرانية للبلدة من 97 دونم في أواخر فترة الانتداب البريطاني إلى نحو 500 دونم عام 1989م، لتبلغ مساحة أراضيها 11100 دونم. و تتعدد الروايات حول تسميتها باسم بني سهيلا و منها:

- نسمة لنجم في السماء اسمه "سهيل" يستدل به التجار قديماً و كان هذا النجم مقابل المدينة لذا نسبت إليه "بني سهيلا".
- نسبة للقبيلة العربية و التي تسمى " بني سهيلا" حيث عاشت فيها و سميت باسمها.
- نسبة لبناء كبير، كان لامرأة رومانية (اسمها سهيلة).
- كون أن المنطقة جغرافيا كانت ممرا للتجار و القوافل حيث يتناسب هذا الوضع و التسمية الأولى.



شكل (1): صورة عن مدينة بني سهيلا

5.2. الخصائص الجغرافية:

5.2.1. الموقع :

تقع مدينة بني سهيلا إلى الجنوب الشرقي لقطاع غزة - شرق مدينة خان يونس - ما بين خط إحداثي محلي شمالي 83.78 درجة، وخط إحداثي محلي شرقي 25.82 درجة، وطبوغرافيا البلد تتغير من 90 متر عن سطح البحر في مركز البلد إلى 45 متر عن سطح البحر غربا في اتجاه ش صلاح الدين وكذلك 72 متر عن سطح البحر شرقا في اتجاه عيسان الكبيرة وعيسان الجديدة وكذلك 50 متر عن سطح البحر في اتجاه

الشمال الشرقي بلدة القرارة، وتبعد عن مركز مدينة خان يونس 5.2 كم غربا وتحيط بها منطقة عسان الكبيرة وعسان الجديدة من ناحية الشرق وبلدية القرارة من الناحية الشمالية ومعن من الناحية الجنوبية. وتعتبر مدينة بني سهيلا بوابة المنطقة الشرقية فمنها يتم الوصول لمدينة عسان الكبيرة وعسان الجديدة والبلديات المحيطة وقد أعطى شارع صلاح الدين أهمية للمدينة حيث يصل جميع محافظات قطاع غزة ببعضها البعض.

5.2.2. المساحة والتضاريس:

تبلغ مساحة مدينة بني سهيلا (12320) دونم، داخل النفوذ حوالي 7662 دونم و مقسمة كالتالي: مساحة المنطقة السكنية 2002 دونم و تم إدخال النفوذ الجديد بمساحة (1386) عام 2014/6/14م، حيث دخلت منطقتي سميري السبع و سوق مازن في هذا النفوذ ليصبح إجمالي النفوذ (7662) دونم ، و (1033) دونم خارج النفوذ جميعها داخل خط الهدنة، و (3499) دونم محتلة من الصهاينة.

من ناحية أخرى، تعد مدينة بني سهيلا جزء من السهل الساحلي الفلسطيني تبعد عن شاطئ البحر حوالي (5) كم ، كما انها منطقة مرتفعة تقع على هضبة عالية ترتفع عن سطح البحر حوالي (95) متر مما أعطى موقعها قيمة جغرافية كبيرة.

شكل (2): صورة جوية لمنطقة بني سهيلا



5.2.3. التربة :

تعتبر تربة مدينة بني سهيلا التربة اللوسية وهي نوع من أنواع التربة الثلاثة في قطاع غزة الساحلي ويوجد في مناطق محدودة من المدينة تربية رملية انتقالية بين التربة الرملية وتربة اللويس. وتتميز تربة اللويس بلونها البني وتركيبها من الطين والرمل الغريني وتحتوي على 8-12 % من كربونات الكالسيوم كما وتعتبر التربة متوسطة الجودة للزراعة .

5.2.4. المناخ :

تمتاز مدينة بني سهيلا بالمناخ المعتدل ويمتد إليها المناخ الصحراوي المتوسطي و يمتد هذا الإقليم في الجزء الجنوبي من قطاع غزة أي خان يونس ورفح، وفي الجزء الغربي وفي الجزء الشرقي الذي يضم مدينة بني سهيلا وعيسان وخزاعة.

5.2.5. الموارد المائية :

يعتبر قطاع المياه من أهم القطاعات التي تهتم بها البلدية حيث يقع على عاتقها مع مصلحة مياه بلديات الساحل تقديم هذه الخدمة للمواطنين، علماً بأن إجمالي احتياج سكان المدينة يبلغ 7000 كوب يومياً. من ناحية أخرى، تعتمد بلدية بني سهيلا على ثلاثة مصادر للمياه الصالحة للشرب وهي كالتالي:

1. "مياه ماكروت" والتي سميت كذلك نسبة لاسم الشركة الموردة وهي شركة تابعة لدولة الاحتلال تورد المياه مقابل مبالغ مالية عالية مقارنة بالمياه التي تحصل عليها البلدية من الآبار الموجودة في القطاع، بالإضافة إلى محدودية الكمية التي توردتها تلك الشركة للمدينة والتي تقدر ب 62000 كوب في الشهر.
 2. "مياه آبار ميراج" سميت بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي تقع فيها وهي منطقة كانت تستخدم كمستوطنات ولكن بعد انسحاب جيش الاحتلال منها تم حفر آبار مياه لتزويد المنطقة الشرقية، علماً أن جودة المياه ممتازة وعذبة أيضاً الكمية تلبى الاحتياجات مع المصادر الأخرى للمياه وتكلفتها أقل من مياه الماكروت وتبلغ كمية المياه التي تصل بني سهيلا من هذه الآبار 62000 كوب في الشهر.
 3. آبار خاصة بالبلدية، وهي آبار ملك للبلدية وتقع داخل نفوذها، وعددها ثلاث آبار، بئر توقف عن العمل بسبب رداءة جودة المياه و ملوحتها، وبئر مع محطة تحليه يعمل حالياً والبئر الثالث جودة مياهه متوسطة ويضخان حوالي 65 كوب في الساعة، و بئر في منطقة الزنة يحتاج لتطويره و تزويده بوحدة مانفلوت بالإضافة لمضخة vertical كما يوجد عدد 2 خزان أرضي بسعة (1000كوب للواحد) يخدم الشبكة بالإضافة لوجود خزان مرتفع سعة 250 كوب يعمل على زيادة الضغط ويستخدم في حالات نقص المياه و ذلك وسط المدينة و كذلك خزانان سعتيهما 4000 كوب تم إنشاؤهما 2015م.
- من ناحية أخرى، تمتلك البلدية لمحطتي تحليه بطاقة 2000 كوب يومياً، تمتلك البلدية محطتي تحليه بطاقة قصوى تصل 2000 م3 في اليوم ومن خلالهما يتم تحسين جودة المياه بصورة.

5.3 الخصائص الديموغرافية لبني سهيلا:

5.3.1 السكان :

تعتبر مدينة بني سهيلا من أكبر تجمعات المنطقة الشرقية من محافظة خانيونس حيث الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة، يوجد فيها ثمانية مدارس ابتدائية وإعدادية ذكور وإناث ومدارس وكالة الغوث وتوجد عيادة صحية حكومية واحدة و بريد ومحكمة شرعية وتسعة عشر مسجدا وإحدى عشر جمعية خيرية وإحدى عشر روضة أطفال. ويبلغ عدد سكان المدينة حسب دائرة الإحصاء المركزي:

السنة										رمز التجمع	اسم التجمع
2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007		
41,174	39,941	38,727	37,536	36,370	35,231	34,132	33,143	32,189	31,272	703425	بني سهيلا


جدول رقم (1) التعداد السكاني للأعوام 2007-2016م

و يقدر التعداد السكاني لبلدة بني سهيلا لعام 2017 قرابة 45000 نسمة. من ناحية أخرى، يعمل معظم سكانها في التجارة والخدمات بمدينة خان يونس ويعمل قسم كبير منهم في المؤسسات الحكومية والبعض الآخر في الزراعة.

5.3.2 التوزيع الجغرافي للسكان :

يتوزع السكان على عشرة أحياء تم اختيار رئيس لكل لجنة حي في بداية عام 2017م من خلال انتخابات وحملة اعلامية شملت المرافق العامة و التجمعات السكانية و المساجد.

شكل (3): خارطة توضح توزيع السكان بأحياء مدينة بني سهيلا

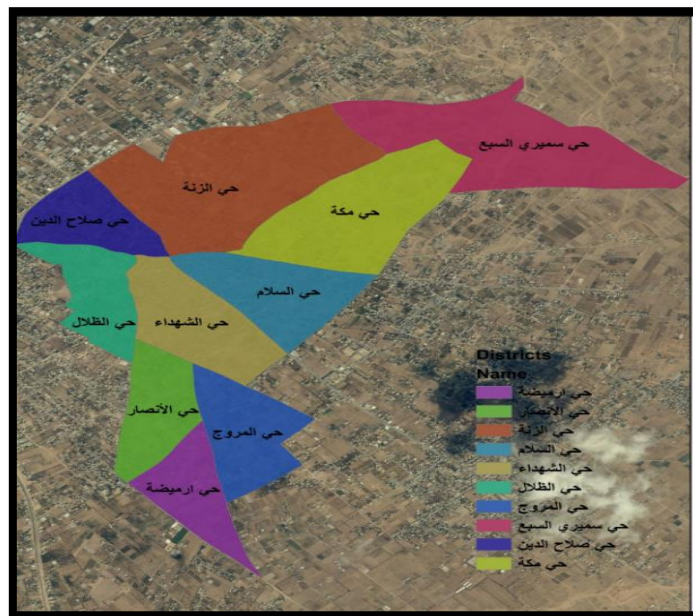

6. الرؤية والتوجهات التنموية

6.1. الرؤية

" مدينة واعدة صناعياً وتجارياً بخدمات متميزة ومستدامة "

6.2. القضايا التنموية ذات الاولوية

الترتيب من الأهم إلى الأقل أهمية	القضايا التنموية
1.	انخفاض مستوى الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة
2.	ضعف مستوى خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار
3.	ضعف شبكة الطرق والمواصلات
4.	ضعف مستوى الخدمات التعليمية والصحية والرياضية
5.	تدني مستوى الاستثمار في القطاع (الزراعي والصناعي)
6.	انخفاض الاستثمارات في القطاع (التجاري والخدمات المساندة)
7.	قلة فرص العمل، وقلة المرافق العامة والترفيهية
8.	ضعف قدرات الهيئة المحلية
9.	ضعف مستوى الخدمات الثقافية والحماية الاجتماعية والتمكين (المرأة/الطفل/الشباب/ذوي الاحتياجات الخاصة)
10.	عدم تلبية المخطط الهيكلي، والمخططات التفصيلية لاحتياجات السكان
11.	انخفاض مستوى جودة الطاقة والاتصالات
12.	قلة الاهتمام بالتراث، والإسكان، والخدمات الاجتماعية
13.	ضعف خدمات الأمن وإدارة الكوارث

6.3. الإطار التنموي

مجال الإدارة والحكم الرشيد (إدارة و حوكمة المؤسسات و خاصة الهيئة المحلية، الامن و إدارة الكوارث، التخطيط و التنظيم)

م.	القضايا التنموية ذات الأولوية	م.	الأهداف التنموية	م.	البرامج	م.	المكونات الرئيسية لكل برنامج (مشاريع)
1	ضعف قدرات الهيئة المحلية	1.1	بناء قدرات الهيئة المحلية	1.1.1	حوسبة العمل البلدي	1.1.1.1	بناء نظام محوسب لإدارة الصيانة والتشغيل.
						1.1.1.2	بناء نظام محوسب لإدارة الوثائق
						1.1.1.3	بناء نظام محوسب لإدارة ملفات التنظيم والتراخيص.
				1.1.2	تحسين وتطوير العمل الإداري في البلدية	1.1.2.1	بناء قدرات الكادر البلدي.
						1.1.2.2	تحديث وتوريد أجهزة ومعدات مكتبية
						1.1.2.3	استكمال و تأثيث مبنى البلدية
				1.1.3	تحسين الخدمة المقدمة للجمهور	1.1.3.1	رفع كفاءة معدات وآليات البلدية، وصيانتها
						1.1.3.2	إنشاء كراج للبلدية
				2	ضعف خدمات الأمن وإدارة الكوارث	2.1	تحسين خدمات إدارة الكوارث
2.1.1.2	توريد كونجو						
2.1.1.3	توريد حفار.						
2.1.1.4	توريد شاحنة صغيرة.						
2.1.1.5	توريد سيارة.						
2.1.1.6	توريد كباش.						
2.1.1.7	توريد عدد أدوات لزوم إدارة الكوارث والطوارئ						
2.1.2	توعية للمجتمع المحلي بمجال إدارة الطوارئ والكوارث						



إنشاء وتجهيز مركز للدفاع المدني.	2.2.1.1	تطوير قدرات الدفاع المدني	2.2.1	توفير وتطوير مرافق الأمن والدفاع المدني	2.2		
توريد وتركيب نقاط لتزويد المياه للدفاع المدني.	2.2.1.2						
إنشاء وتجهيز مركز للشرطة	2.2.2.1	تعزيز قدرات الخدمات الشرطة	2.2.2				
استكمال المخططات التفصيلية للمناطق التي تم توسعتها بعد 2009-2014.	3.1.1.1	تطوير المخططات التفصيلية للبلدة، والقضاء على العشوائية	3.1.1	تحديث المخطط الهيكلي، والمخططات التفصيلية بما يتلاءم مع احتياجات السكان	3.1		عدم تلبية المخطط الهيكلي، والمخططات التفصيلية لاحتياجات السكان
إعداد مشاريع افراز.	3.1.1.2						
توعية المجتمع المحلي بأهمية تنفيذ مشاريع الإفراز	3.1.1.3						
تحديث المخطط الهيكلي للبلدة.	3.1.2.1	تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للبلدة	3.1.2				
توفير صورة جوية حديثة لنفوذ البلدة.	3.1.2.2						
ترقيم المباني وتسمية الشوارع على الطبيعة والمخطط، وربطها GIS.	3.2.1.1	تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.	3.2.1	زيادة المشاريع المساحية، وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.	3.2		
توريد أجهزة الرفع المساحي GPS	3.2.1.2	توريد معدات وأجهزة لزوم الرفع المساحي لمناطق النفوذ	3.2.2				
توريد جهاز Total station	3.2.1.3						
توريد أجهزة Tablets عدد 10	3.2.1.4						



مجال البيئة والبنى التحتية (الطاقة والاتصالات، الطرق والمواصلات، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار، والنفايات)

م.م	القضايا التنموية ذات الأولوية	م.م	الأهداف التنموية	م.م	البرنامج	م.م	المكونات الرئيسية لكل برنامج (مشاريع)					
1	نخفاض مستوى جودة الطاقة والاتصالات	1.1	استغلال مصادر الطاقة البديلة	1.1	1.1.1	1.1.1	حملة ترشيد الاستهلاك عبر الإذاعة و ضبط الاستهلاك غير القانوني					
					1.1.2	1.1.2	تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في المنازل.					
					1.1.2.1	1.1.2	توريد فوانيس انارة شوارع موفرة للطاقة					
					1.1.2.2	1.1.2	صيانة شبكة الانارة في البلدة					
					1.2.1.1	1.1.3	انارة ميادين البلدة الرئيسية باستخدام الخلايا الشمسية.					
					1.2.1.2	1.1.3	تشغيل نظم التبريد و التسخين في البلدية باستخدام مصادر الطاقة البديلة.					
					1.2.1.3	1.1.3	تشغيل الآبار الصغيرة المزودة البلدية بمصادر المياه بالطاقة الشمسية.					
					1.2.1.1	1.2	1.2.1	توسيع شبكة الهواتف الأرضية والمحمول				
					1.2.1.1	2	2.1	تحسين اتصالات السلكية واللاسلكية	2.1.1	تطوير و تبليط شوارع ترابية	2.1.1.1	تطوير و تبليط شارع الشهداء
					2.1.1.2						رصف و تبليط شوارع داخلية	
2.1.1.3	رصف و تبليط شارع الفاروق											
2.1.1.4	رصف شارع رائد الرقب											
2.1.1.5	صيانة شارع أبو سرور											
2.1.1.6	رصف شارع الإيمان											
2.1.1.7	رصف شارع أبو جهاد											



2.1.1.8	رصف شارع أبو اسحاق	إعادة تأهيل و صيانة شوارع معبدة	2.1.2			
2.1.1.9	رصف شارع يافا					
2.1.1.10	رصف شارع الفجم أبو سمور					
2.1.1.11	رصف شارع البساتين أبو شرخ					
2.1.1.12	رصف شارع عز الدين القسام					
2.1.1.13	رصف شارع الأتصار					
2.1.2.1	إعادة تأهيل شارع الشهداء					
2.1.2.2	إعادة تأهيل شارع مكة					
2.1.2.3	صيانة شارع العودة					
2.1.2.4	صيانة شارع حندق (عمر بن الخطاب).					
2.1.2.5	صيانة شارع القدس					
2.1.2.6	صيانة شارع أبو علي إيباد					
2.1.2.7	صيانة شارع الروضة					
2.1.2.8	صيانة شارع عمرو بن العاص					
2.1.2.9	توريد مواد صيانة طرق و بني تحتية و مباني					
2.2.1.1	إنشاء و تهيئة الأرصفة و دهان ممرات المشاة و المداخل	تحسين السلامة المرورية	2.2.1	تحسين الوضع المروري لشوارع البلدة	2.2	
2.2.1.2	وضع اشارات مرور ارشادية					
3.1.1.1	استبدال العدادات المنزلية (العطلانة)	زيادة مصادر المياه و الحفاظ عليها	3.1.1	تحسين مستوى خدمات المياه (كماً ونوعاً)	3.1	ضعف مستوى خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار
3.1.1.2	صيانة شبكة المياه القائمة					
3.1.1.3	إنشاء آبار مياه جديدة عدد 3					
3.1.1.4	إنشاء خزان مياه عدد 2					



حملات توعية لترشيد استهلاك المياه	3.1.2.1	توعية المواطن بترشيد استهلاك المياه	3.1.2		
صيانة محطات التحلية القائمة	3.1.3.1				
إنشاء محطات تحلية صغيرة عدد 2 بالقرب من المدارس بطاقة إنتاجية 25 كوب يومياً.	3.1.3.2	تحسين جودة المياه	3.1.3		
توريد مضخات	3.2.1.1	تحسين قدرات البلدية في كسح آبار الصرف الصحي	3.2.1	تطوير شبكة الصرف الصحي للبلدة لتشمل المنطقة الشرقية	3.2
صيانة سيارة كسح آبار الصرف الصحي	3.2.1.2				
توريد آليات لكسح آبار الصرف الصحي (جتر + سيارة كسح)	3.2.2.1				
إنشاء محطة ضخ رقم 4	3.2.2.2				
إنشاء الخط الناقل من صوفا إلى محطة رقم 4	3.2.2.3				
إعادة تأهيل محطة ضخ رقم 5	3.2.2.4	تحسين شبكة الصرف الصحي	3.2.2		
إنشاء الخط الناقل من محطة رقم 4 إلى محطة رقم 5	3.2.2.5				
توسعة شبكة الصرف الصحي للمناطق غير المغطاة	3.2.2.6				
صيانة شبكة الصرف الصحي القائمة	3.2.2.7				
تأهيل وادي أبو نصير	3.3.1.1				
تأهيل واد ارميضة	3.3.1.2				
تأهيل وادي القرا	3.3.1.3	الاستفادة من مياه الأمطار	3.3.1		
تأهيل وادي أبو الحصو	3.3.1.4				
تأهيل وادي أبو هجرس	3.3.1.5				



حقن مياه الأمطار	3.3.1.6					
إنشاء برك تجميع لمياه المطر للمزارعين	3.3.2.1	دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة	3.3.2			
إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار و من مجاري الأودية.	3.3.2.2					
إنشاء منتزه بلدي	4.1.1.1	إنشاء المرافق الداعمة للصحة العامة	4.1.1	زيادة مستوى الصحة العامة	4.1	4 انخفاض مستوى الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة
إنشاء حديقة في منطقة الزنة	4.1.1.2					
تشجير شوارع البلدة	4.1.1.3					
توفير جهاز فوكر كبير و مواد رش الباعوض و مواد لمكافحة القوارض	4.1.2.1	توريد آليات ومعدات	4.1.2			
توريد بوب كات	4.1.2.2					
توريد حاويات حديد بسعة 1 كوب	4.2.1.1	تحسين مستوى نظافة البلدة	4.2.1	تحسين إدارة (جمع وترحيل وفرز وتدوير) النفايات الصلبة	4.2	
توريد حاويات بلاستيكية سعة 60 لتر و أدوات نظافة	4.2.1.2					
توريد كمباتر صغير سعة 3 كوب.	4.2.1.3					
توريد كباش صغير بقوة لا تقل عن 120 حصان	4.2.1.4					
تشغيل عمال نظافة وكارات لجمع و ترحيل النفايات المنزلية من بيت لبيت.	4.2.1.5					
توفير أرض كمحطة ترحيل	4.2.1.6					
توريد سيارة ترحيل نفايات صلبة قدرة 18 طن	4.2.1.7					
توعية المجتمع المحلي صحياً وبيئياً	4.3.1.1	تعزيز الإرشاد الصحي والبيئي	4,3,1	زيادة الوعي الصحي والبيئي	4.3	
إنشاء و تجهيز مركز التثقيف الصحي داخل دائرة الصحة و البيئة	4.3.1.2					





مجال التنمية الاجتماعية (الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية و التمكين، التراث و الثقافة، الرياضة و السكن)

م	القضايا التنموية ذات الأولوية	م	الأهداف التنموية	م	البرامج	م	المكونات الرئيسية لكل برنامج (مشاريع)
1	ضعف مستوى الخدمات التعليمية والصحية والرياضية	1.1	تحسين مستوى الخدمات التعليمية	1.1.1	تحسين جودة التعليم كما ونوعاً	1.1.1.1	إنشاء مدرسة ثانوية
						1.1.1.2	إنشاء مدرسة حكومية عدد (2)
						1.1.1.3	إنشاء عدد 1 مدرسة وكالة
						1.1.1.4	تأهيل وتطوير المدارس الحالية
						1.1.2.1	إنشاء مدرسة صناعية ومهنية
		1.2	تحسين مستوى الخدمات الرياضية	1.2.1	إنشاء ملاعب رياضية	1.2.1.1	إنشاء ملعب بلدي مركزي
						1.2.1.2	إنشاء نادي نسوي
						1.2.1.3	إنشاء صالة مغلقة
						1.2.2.1	دعم أندية وصالات القطاع الخاص.
						1.2.2.2	تطوير الملاعب الخماسية في المدينة
1.2.2.3	الاهتمام في الفرق الرياضية						
1.3	تحسين مستوى الخدمات الصحية	1.3.1	الارتقاء بالخدمات الصحية	1.3.1.1	إنشاء عيادات تخصصية		
				1.3.1.2	إنشاء مجمع طبي		
				1.3.1.3	تطوير مستوصف بني سهيلا الحكومي		
				1.3.1.4	إنشاء عيادة تخصصية نساء وولادة		
				1.3.2.1	تدريب وتوعية صحية		
				1.3.2.2	تنظيم حملات ارشاد نفسي		
2	ضعف مستوى الخدمات الثقافية والحماية الاجتماعية	2.1	تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة والطفل	2.1.1	تفعيل دور المرأة في المجتمع	2.1.1.1	دعم المرأة الريفية
						2.1.1.2	حملات توعية المرأة حقوقياً وعلمياً ومعرفياً



إنشاء وحدة لتنمية العمل النسوي الحرفي في النادي النسوي	2.1.1.3			والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة	والتمكن (المرأة/الطفل/الشباب/ذوي الاحتياجات الخاصة)	
توريد وتوزيع مقاعد كهربائية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة	2.1.2.1		2.1.2 دعم ذوي الاحتياجات الخاصة			
تأهيل المرافق العامة في بني سهيلا لذوي الاحتياجات الخاصة	2.1.2.2					
إنشاء مركز شبابي متكامل	2.1.3.1					
تطوير قدرات إذاعة البلدية الالكترونية	2.1.3.2					
تطوير وتجهيز المركز الشبابي التنسيقي لبلدية بني سهيلا	2.1.3.3		2.1.3 دعم الشباب			
دعم المعارض الشبابية الحرفية.	2.1.3.4					
إنشاء مكتبة عامة	2.2.1.1					
تعزيز العمل الروائي والتكنولوجي لدى طلاب الثانوية (دعم لمبادرات-إطلاق المسابقات)	2.2.1.2		2.2.1 احتضان العمل الروائي والثقافي للنشأ.		2.2 زيادة الأماكن الثقافية	
نشر وتوزيع كتاب بني سهيلا تراث وأنساب	2.2.2.1					
دعم المنتجات التراثية التقليدية (البسة - اكسسوارات-أدوات منزلية-أثاث تقليدي).	2.2.2.2		2.2.2 تطوير الجانب الثقافي والتراثي لبلدة بني سهيلا			
التنظيم للأيام الوطنية والمعززة للتراث.	3,1,1,1					
إطلاق حملات البحث عن الآثار والتراث بين المواطنين.	3,1,1,2		3,1,1 احياء الأيام الوطنية والتراثية	3,1 زيادة الاهتمام بالتراث والآثار	قلة الاهتمام بالتراث، والإسكان، والخدمات الاجتماعية	3
انشاء متحف ومعرض للمقتنيات الأثرية	3,1,2,1		3,1,2 حفظ المقتنيات الفلسطينية في المنطقة			
تعزيز استخدام نظام المجاورة السكنية	3,2,1,1		3,2,1 تحسين جودة السكن	3,2 زيادة الاهتمام بالإسكان		



استكمال ملف الاعمار 2014 للمنازل المهدومة من الاعتداءات الصهيونية.	3,2,1,2			لذوي الدخل المحدود والشباب	
إنهاء وجود بيوت الأسبستوس في بني سهيلا	3,2,1,3				
إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية - حكومي	3,3,1,1	توفير الخدمات الاجتماعية في البلدة	3,3,1	زيادة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية	3,3

مجال تنمية الاقتصاد المحلي (العمالة و التوظيف، التجارة و الصناعة و الخدمات المساندة، الترفيه و السياحة، الزراعة)

م	القضايا التنموية ذات الأولوية	م	الأهداف التنموية	م	الاحتياجات	م	المكونات الرئيسية لكل برنامج (مشاريع)
1	قلة فرص العمل، وقلة المرافق العامة والترفيهية	1.1	رفع مستوى العمالة، زيادة دخل الأسرة	1.1.1	توفير فرص عمل للخريجين والعمال.	1.1.1.1	إنشاء مركز مهني.
						1.1.1.2	إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة
						1.1.1.3	تطوير قدرات [خريجين-عمال مهنيين]
						1.1.1.4	تطوير قاعدة بيانات بعمال ومهنيين البلدة.
2	نخفاض الاستثمارات في القطاع (التجاري والخدمات المساندة)	2.1	تشجيع الاستثمار في القطاع التجاري	2.1.1	زيادة الاستثمار التجاري	2.1.1.1	تطوير السوق الشعبي
						2.1.1.2	إنشاء سوق مركزي للجملة.
						2.1.1.3	إنشاء مركز تجاري
1	قلة فرص العمل، وقلة المرافق العامة والترفيهية	1.2	زيادة عدد المرافق العامة والترفيهية	1.2.1	توفير مرافق الخدمات العامة	1.2.1.1	تطوير مواقف للسيارات
						1.2.1.2	إنشاء مظلات انتظار
						1.2.2.1	إنشاء مدينة ألعاب تخدم المنطقة الشرقية
						1.2.2.2	زيادة عدد المنتجعات والشاليهات



تأهيل مقر البلدية القديم تأجير مكاتب "عمارة بلدية بني سهيلا".	2,1,1,4					
فتح مكاتب خدماتية (تاكسيات، سياحة وسفر... الخ)	2.2.1.1	تحسين الخدمات المساندة	2.2.1	تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات المساندة	2.2	
إنشاء مخبز آلي في المناطق المهمشة	2.2.1.2					
إنشاء محلات الوجبات السريعة	2.2.1.3					
تنفيذ مشروع انشاء دفيئات زراعية	3.1.1.1	زيادة المنتج الزراعي	3,1,1	دعم القطاع الزراعي واستثمار امكانيات البلدة الزراعية	3.1	تدني مستوى الاستثمار في القطاع (الزراعي والصناعي)
استصلاح أراضي بأشجار مثمرة	3.1.1.2					
تمديد خطوط مياه ناقله للمناطق الزراعية	3.1.1.3					
توريد وتركيب شبكات ري	3.1.2.1	دعم المزارعين	3,1,2			
إنشاء خزان مياه للزراعة سعة 10 كوب.	3.1.2.2					
توعية وارشاد للمزارعين (أفضل جودة بأقل تكلفة)	3.1.2.3					
توريد أسمدة وبيذور	3.1.2.4	الاستثمار في القطاع الزراعي	3,1,3			
تسييج أراضي زراعية	3.1.2.5					
شق و تأهيل طرق زراعية	3.1.2.6					
إنشاء مسلخ للدواجن	3.1.3.1	زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة	3.1.4			
إنشاء مزرعة لبيع الماشية	3.1.3.2					
انشاء برك تجميع لمياه المطار للمزارعين عدد 2 سعة 15 كوب للوحدة	3.1.4.1					
إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار و من مجاري الأودية.	3.1.4.2					



توريد عدادات مياه للمزارعين	3.1.4.3					
انشاء مصنع للصناعات الغذائية.	3.2.1.1	تحسين الاستثمار الصناعي	3,2,1	تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي	3.2	
التأسيس للمدينة الصناعية للمنطقة الشرقية	3.2.1.2					
انشاء مصنع تعليب خضار	3.2.1.3					

7. خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم

7.1. خطة التنفيذ الرباعية

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2018-2021				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التعموي
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	مضمون	محتمل	متمنى	الصرف السنوي									
قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني							الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
10	MDLF	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية			✓					10	GO.1.1.1.1	بناء نظام محوسب لإدارة الصيانة والتشغيل.	GO\1.1.1	حوسبة العمل البلدي	الإدارة والحكم الرشيد
30	MDLF	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الشؤون الإدارية و المالية	✓			30				30	GO.1.1.1.2	بناء نظام محوسب لإدارة الوثائق			
30	MDLF	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية	✓			30				30	GO.1.1.1.3	بناء نظام محوسب لإدارة ملفات التنظيم والتراخيص.			
25	MDLF	5	تدريب و تطوير الموظفين	-	-	الدائرة المالية و الإدارية		✓				5	5	15	25	GO.1.1.2.1	بناء قدرات الكادر البلدي.	GO\1.1.2	تحسين وتطوير العمل الإداري في البلدية
40	MDLF	30	أجهزة و أدوات مكتبية صيانة حواسيب	-	-	الفنية /والإدارية والمالية		✓				40	30	70	GO.1.1.2.2	تحديث وتوريد أجهزة ومعدات مكتبية			



80	MDLF	20	مصاريف ادارية	-	-	الفنية والإدارية والمالية			✓					125	125	GO.1.1.2.3	استكمال و تأثيث مبنى البلدية		
80	MDLF IHH UNRW A	20	مصاريف الأشغال العامة	-	-	الدائرة الفنية/الادارية والمالية			✓	25	25	25	25	100		GO.1.1.3.1	رفع كفاءة معدات وآليات البلدية، وصيانتها	GO\1. 1.3	تحسين الخدمة المقدمة للجمهور
200	MDLF الصندوق الإسلامي للتنمية بكدار	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادارية والمالية	✓			200			200		GO.1.1.3.2	إنشاء كراج للبلدية			
35	MDLF UNDP WB	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادارية والمالية	✓			35			35		GO.2.1.1.1	توريد بوب كات	GO\2. 1.1	توريد آليات ومعدات لإدارة الكوارث والطوارئ	
2	MDLF IHH UNRW A	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادارية والمالية	✓			2			2		GO.2.1.1.2	توريد كونجو			
100	MDLF IHH UNRW A أمان ماليزيا	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادارية والمالية	✓			100			100		GO.2.1.1.3	توريد حفار.			



50	MDLF IHH UNRW A أمان ماليزيا	20	مصاريف الأشغال العامة	-	-	الدائرة الفنية/الادار ية والمالية	✓			50	50	GO.2.1.1.4	توريد شاحنة صغيرة.				
20	MDLF IHH الهلل الحمري التركي	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادار ية والمالية	✓			20	20	GO.2.1.1.5	توريد سيارة.				
90	MDLF IHH UNRW A	-	-	-	-	الدائرة الفنية/الادار ية والمالية	✓			90	90	GO.2.1.1.6	توريد كباش.				
50	MDLF IHH UNRW A ACF Shelter Cluster	50	المصاريف التشغيلية العامة	-	-	الدائرة الإدارية و المالية- لجنة الكوارث		✓		25	25	25	25	100	GO.2.1.1.7	توريد عدد وأدوات لزوم إدارة الكوارث والطوارئ	
9	WB MDFL	6	أنشطة تنقيفية و توعوية و مجتمعية	-	-	الدائرة الإدارية و المالية- لجنة الكوارث		✓		5	5	5	15	GO.2.1.2.1	توعية للمجتمع المحلي بمجال إدارة الطوارئ والكوارث	GO\2. 1.2	تأهيل وتطوير قدرات المجتمع المحلي



400	WB MDFL PUI- مؤسسة التعاون بكار صندوق التنمية الإسلامي	-	-	إداري +تنفيذ	المديرية العامة للدفاع المدني	الدائرة الإدارية و المالية- لجنة الكوارث	✓			400	400	GO.2.2.1.1	إنشاء وتجهيز مركز للدفاع المدني.	GO\2. 2.1	تطوير قدرات الدفاع المدني	
200	-الصليب الأحمر الفلسطيني -الهلال الأحمر الفلسطيني	-	-	إداري +تنفيذ	المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني		✓		200	200	GO.2.2.1.2	توريد وتركيب نقاط لتزويد المياه للدفاع المدني.				
60	MDFL	-	-	-	-	شرطة البلديات		✓	20	20	20	60	GO.2.2.2.1	إنشاء وتجهيز مركز للشرطة	GO\2. 2.2	تعزيز قدرات الخدمات الشرطية
20	MDFL	5	عدد و لوازم هندسية التخطيط	الاعتماد	وزارة الحكم المحلي- اللجنة المركزية	الدائرة الفنية- قسم التنظيم		✓	15	10		25	GO.3.1.1.1	استكمال المخططات التفصيلية للمناطق التي تم توسعتها بعد 2009-2014.	GO\3. 1.1	تطوير المخططات التفصيلية للبلدة، والقضاء على العشوائية



20	MDFL	5	عدد و لوازم هندسية	الاعتماد	وزارة الحكم المحلي- اللجنة المركزية	الدائرة الفنية- قسم التنظيم		✓		5	6	6.2 5	6.2 5	25	GO.3.1.1.2	إعداد مشاريع افراز.		
8	WB MDFL	2	أنشطة تنقيفية و توعوية و مجتمعية	-	-	الدائرة الفنية- قسم التنظيم		✓		2.5	2.5	2.5	2.5	10	GO.3.1.1.3	توعية المجتمع المحلي بأهمية تنفيذ مشاريع الإفراز		
130	WB UNDF MDFL	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم التنظيم	✓			130				130	GO.3.1.2.1	تحديث المخطط الهيكل للبلدة.	GO\3. 1.2	تحديث وتطوير المخطط الهيكل للبلدة
10	البنك الإسلامي للتنمية IDB	-	-	-	UNDP- PAPP	الدائرة الفنية		✓				10		10	GO.3.1.2.2	توفير صورة جوية حديثّة لنفوذ البلدة.		
60	البنك الإسلامي للتنمية IDB	-	-	-	UNDP- PAPP	الدائرة الفنية			✓				60	60	GO.3.2.1.1	ترقيم المباني وتسمية الشوارع على الطبيعة و مخططات، وربطها GIS .	GO\3. 2.1	تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.



5	البنك الإسلامي للتنمية IDB	-	-	-	UNDP-PAPP	الدائرة الفنية	✓			5	5	GO.3.2.2.1	توريد أجهزة الرفع المساحي GPS	GO\3.2.2	توريد معدات و أجهزة لزوم الرفع المساحي لمناطق النفوذ	
8	البنك الإسلامي للتنمية IDB	2	عدد و لوازم هندسية	-	UNDP-PAPP	الدائرة الفنية	✓			10	10	GO.3.2.2.2	توريد جهاز station Total			
5	البنك الإسلامي للتنمية IDB	-	-	-	UNDP-PAPP	الدائرة الفنية	✓			5	5	GO.3.2.2.2	توريد أجهزة Tablets عدد 10			
										117.5	128.5	103.7 5	238.75	1942	المجموع الجزئي	



الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2018-2021				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التعموي
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	مضمون			الصرف السنوي									
قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعني	متمنى	محتمل	مضمون	الارابعة	الثالثة	الثانية	الأولى						
5	WB MDFL	5	أنشطة تنقيفية و توعوية و مجتمعية	-	-	دائرة العلاقات العامة		✓		2.5	2.5	2.5	2.5	10	E\1.1.1.1	حملات ترشيد الاستهلاك عبر الإذاعة و ضبط الاستهلاك عبر القانوني	E\1.1. 1	توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك للكهرباء مع الضبط القانوني	البيئة و البنية التحتية
10	WB MDFL	-	-	-	-	دائرة العلاقات العامة		✓			5	5		10	E\1.1.1.2	تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في المنازل.			
50	WB MDFL GIZ KFW	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓			50				50	E\1.1.2.1	توريد فوانيس إنارة شوارع موفرة للطاقة	E\1.1. 2	تحسين شبكة الإنارة في البلدة	



200	WB MDFL GIZ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓			200	200	E\1.1.2.2	صيانة شبكة الإنارة في البلدة		
20	-الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	-	-	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓			20	20	E\1.1.3.1	إنارة ميادين البلدة الرئيسية باستخدام الخلايا الشمسية	E\1.1. 3	استخدام الطاقة الشمسية و البديلة
150	-الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	-	-	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓			150	150	E\1.1.3.2	تشغيل نظم التبريد و التسخين في البلدية باستخدام مصادر الطاقة البديلة		



40	وزارة الزراعة الرحمة الدولية MDFL	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				20	20		40	E\1.1.3.3	تشغيل الآبار الصغيرة المزودة للبلدية بمصادر المياه بالطاقة الشمسية		
200	GIZ Pitca شركة الاتصالات			إداري	وزارة الاتصالات	الدائرة الفنية	✓				200			200	E\1.2.1.1	توسعة شبكة الهواتف الأرضية و المحمول	E\1.2.1	توفير خدمات الاتصال السلكي واللاسلكي
1735	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية							1735	1735	E\2.1.2.1	تطوير شارع الشهداء (المرحلة الأولى)		
350	صندوق البلديات MDLF	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية	✓		100	100	100	50	350	E\2.1.2.2	رصف و تبليط شوارع داخلية	E\2.1.2	تطوير و تبليط شوارع متفرقة	
600	صندوق البلديات MDLF			إداري	صندوق البلديات MDLF	الدائرة الفنية	✓		100	100	100	300	600	E\2.1.2.3	تطوير و تبليط شوارع بطول 30 كم			
350	MDLF	-	المصاريف التشغيلية العامة	إداري مالي	وزارة الحكم المحلي MDLF	الدائرة الفنية	✓		100	100	100	50	350	E\2.1.2.1	تأهيل و صيانة شوارع معبدة بواقع 2م100.000	E\2.1.2	إعادة تأهيل و صيانة شوارع معبدة	



160	MDLF	-	-	إداري مالي	وزارة الحكم المحلي MDLF			✓	40	40	40	40	160	EI\2.1.2.2	توريد مواد صيانة طرق و بنية تحتية و مباني		
100	MDLF جمعية فلسطين للسلامة المرورية	-	-	إداري فني	شرطة المرور وزارة المواصلات	الدائرة الفنية		✓	100				100	EI\2.2.1.1	إنشاء و تهيئة الأرصفة و دهان ممرات المشاة و المداخل	EI\2.2.1	تحسين السلامة المرورية
10	مؤسسات المجتمع المدني	-	-	إداري فني	وزارة الحكم المحلي وزارة المواصلات	الدائرة الفنية		✓			10		10	EI\2.2.1.2	وضع اشارات مرور ارشادية		
-	-	10	تكلفة خدمة المياه	-	-	قسم المياه		✓	2.5	2.5	2.5	2.5	10	EI\2.2.1.3	استبدال العدادات المنزلية (العطلانة)	EI\3.1.1	زيادة مصادر المياه و الحفاظ عليها
140	أنيرا	60	تكلفة خدمة المياه	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه		✓	50	50	50	50	200	EI\3.1.1.1	صيانة شبكة المياه القائمة		



300	أنيرا IHH حياة يولو			إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه	✓						300	300	E\3.1.1.2	إنشاء آبار مياه جديدة عدد 3		
400	الرحمة الكويتية العالمية MDLF CHF			إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه	✓						400	400	E\3.1.1.3	إنشاء خزان مياه عدد 2		
20	مؤسسات دولية	-	-	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه			✓			20	20	E\3.1.2.1	حملات توعية لترشيد استهلاك المياه	E\3.1. 2	توعية المواطن بترشيد استهلاك المياه	
180	مؤسسات دولية + مصلحة بلديات الساحل	20	مشتريات المياه	إداري مالي	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه			✓			100	100	E\3.1.3.1	صيانة محطات التحلية القائمة			
100	مؤسسات دولية + مصلحة بلديات الساحل	-	-	إداري مالي	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه			✓	50	50		100	E\3.1.3.2	إنشاء محطات تحليه صغيرة عدد 2 بالقرب من المدارس بطاقة إنتاجية 25 كوب يومياً.	E\3.1. 3	تحسين جودة المياه	



100	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	-	إداري مالي	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم المياه	✓				100	100	EI\3.2.1.1	توريد مضخات	EI\3.2.1	تحسين قدرات البلدية في كسح آبار الصرف الصحي
10	مؤسسات دولية	5	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة		✓		5	5	5	15	EI\3.2.1.2		
200	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة	✓				200	200	EI\3.2.2.1	توريد آليات الكسح آبار الصرف الصحي (جتر + سيارة كسح)	EI\3.2.2	تحسين شبكة الصرف الصحي
500	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة	✓				500	500	EI\3.2.2.2	إنشاء محطة ضخ رقم 4		
1000	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة	✓				1000	1000	EI\3.2.2.3	إنشاء الخط الناقل من صوفا إلى محطة رقم 4		
150	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة	✓				150	150	EI\3.2.2.4	إعادة تأهيل محطة ضخ رقم 5		
500	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة	✓				500	500	EI\3.2.2.5	إنشاء الخط الناقل من محطة رقم 4 إلى محطة رقم 5		



500	مؤسسات دولية	-	الصرف الصحي	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم الصحة و البيئة	✓				500	500	E\3.2.2.6	توسعة شبكة الصرف الصحي للمناطق غير المغطاة				
120	مؤسسات دولية	20	الصرف الصحي	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم الصحة و البيئة	✓			30	30	30	30	120			E\3.2.2.7	صيانة شبكة الصرف الصحي القائمة
150	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓			50	50	50		150	E\3.3.1.1	تأهيل وادي أبو نصير	E\3.3.1	الاستفادة من مياه الأمطار
100	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓			100				100	E\3.3.1.2	تأهيل واد ارميضة		
150	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓			150				150	E\3.3.1.3	تأهيل وادي القرا		
200	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓			200				200	E\3.3.1.4	تأهيل وادي أبو الحسو		
100	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓			100				100	E\3.3.1.5	تأهيل وادي أبو هجرس		



400	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية	✓						400	400	E\3.3.1.6	حقن مياه الأمطار			
50	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	وزارة الزراعة	الدائرة الفنية	✓						50	50	E\3.3.2.1	إنشاء برك تجميع لمياه الأمطار للمزارعين	E\3.3.2	دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة	
100	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	وزارة الزراعة	الدائرة الفنية	✓						100	100	E\3.3.2.2	إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار و من مجاري الأودية.			
200	مؤسسات دولية	-	-	إداري و -	-	الدائرة الفنية	✓						200	200	E\4.1.1.1	إنشاء منتزه بلدي			
200	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية		✓					100	100	200	E\4.1.1.2	إنشاء حديقة في منطقة الزنة	E\4.1.1	إنشاء المرافق الداعمة للصحة العامة
100	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة			✓			25	25	25	25	100	E\4.1.1.3		



30	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة	✓				30	30	EIV4.1.2.1	توفير جهاز فوكر كبير و مواد رش الباعوض و مواد لمكافحة القوارض	EIV4.1.2	توريد آليات ومعدات	
30	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة	✓				30	30	EIV4.1.2.2	توريد بوب كات			
80	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	-	تكلفة إدارة النفايات الصلبة	-	-	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة		✓	20	20	20	20	80	EIV4.1.2.3	توريد حاويات حديد بسعة 1 كوب	EIV4.2.1	تحسين مستوى نظافة البلدة
40	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	20	تكلفة إدارة النفايات الصلبة	-	-	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة	✓				60	60	EIV4.2.1.1	توريد حاويات بلاستيكية سعة 60 لتر و أدوات نظافة			
80	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	-	-	-	-	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة	✓				80	80	EIV4.2.1.2	توريد كمباكتر صغير سعة 3 كوب.			
80	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	-	-	-	-	الدائرة الفنية+ الصحة و البيئة	✓				80	80	EIV4.2.1.3	توريد كياش صغير بقوة لا تقل عن 120 حصان			



100	وزارة العمل	-	-	-	-	قسم الصحة و البيئة + الشؤون الإدارية و المالية	✓			50	50			100	EI\4.2.1.4	تشغيل عمال نظافة و كارات لجمع و النفايات المنزلية من بيت لبيت.				
100	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	-	-	-	-	الشؤون الإدارية و المالية + الشؤون القانونية	✓			100				100	EI\4.2.1.5	توفير أرض كمحطة ترحيل				
100	مجلس إدارة النفايات الصلبة+ MDLF	-	-	-	-	الشؤون الإدارية و المالية + الشؤون القانونية	✓			100				100	EI\4.2.1.6	توريد سيارة ترحيل نفايات صلبة قدرة 18 طن				
30	مؤسسات دولية	10	تكلفة إدارة النفايات الصلبة	إداري و فني	مؤسسات دولية	قسم الصحة و البيئة	✓			20	20			40	EI\4.3.1.1	توعية المجتمع المحلي صحياً وبيئياً	EI\4.3.1	تعزيز الإرشاد الصحي والبيئي		
10	مؤسسات دولية	100	تكلفة إدارة النفايات الصلبة	إداري و فني	مؤسسات دولية	قسم الصحة و البيئة	✓			20				20	EI\4.3.1.2	إنشاء و تجهيز مركز التنظيف الصحي داخل دائرة الصحة و البيئة				
										740	770	680	2310	10670	المجموع الجزئي					



الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				الجهة المرشحة للتنفيذ			تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2018-2021				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التعموي
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	متمنى	محتمل	مضمون	الصرف السنوي									
قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعنى				الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى						
500	مؤسسات دولية	-	-	إداري و فني	وزارة التربية و التعليم	الدائرة الفنية -قسم التنظيم	✓				500				500	SO\1.1.1.1	إنشاء مدرسة ثانوية	SO\1.1.1	تحسين جودة التعليم كماً ونوعاً
2300	مؤسسات دولية	200	توفير أراضي	إداري و فني	وزارة التربية و التعليم	الدائرة الفنية			✓			625	625	1250	2500	SO\1.1.1.2	إنشاء مدرسة أساسية عدد 2		
1600	مؤسسات دولية	100	توفير أراضي	إداري و فني و مالي	وكالة الغوث	الدائرة الفنية	✓				1700				1700	SO\1.1.1.3	إنشاء عدد 1 مدرسة وكالة		
250	وزارة التربية و التعليم	-	-	إداري و فني	وزارة التربية و التعليم	-			✓		100	100	50		250	SO\1.1.1.4	تأهيل وتطوير المدارس الحالية		
800	المؤسسات الدولية	-	-	إداري و فني	وزارة الرياضة و الشباب		✓				800				800	SO\1.2.1.1	إنشاء ملعب بلدي مركزي		



400	المؤسسات الدولية	-	-	إداري و فني	وزارة شؤون المرأة		✓						400	400	SO\1.2.1.2	إنشاء نادي نسوي		
800	المؤسسات الدولية	-	-	إداري و فني	وزارة الرياضة و الشباب		✓						800	800	SO\1.2.1.3	إنشاء صالة مغلقة		
200	وزارة الرياضة و الشباب	-	-	إداري و فني	وزارة الرياضة و الشباب		✓			50	50	50	50	200	SO\1.2.2.1	دعم أندية وصلات القطاع الخاص.		
380	وزارة الرياضة و الشباب	20	خدمات حضارية و ثقافية	إداري و فني	وزارة الرياضة و الشباب	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓			100	100	100	100	400	SO\1.2.2.2	تطوير الملاعب الخماسية في المدينة	SO\1.2.2	تطوير الأندية الرياضية
100	وزارة الرياضة و الشباب	-	-	إداري و فني	وزارة الرياضة و الشباب	دائرة العلاقات العامة و الإعلام- اللجنة الرياضية	✓			25	25	25	25	100	SO\1.2.2.3	الاهتمام في الفرق الرياضية		
400	200	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	الدائرة الفنية-قسم التنظيم	✓						400	400	SO\1.3.1.1	إنشاء عيادات تخصصية	SO\1.3.1	الارتقاء بالخدمات الصحية



58	مساهمة مجتمع + محلي تبرعات	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	الدائرة الفنية-قسم التنظيم			✓			130	130	260	SO\1.3.1.2	إنشاء مجمع طبي		
202	مؤسسة التعاون																	
300	مساهمة مجتمع + محلي تبرعات	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	الدائرة الفنية-قسم التنظيم			✓			300		300	SO\1.3.1.3	تطوير مستوصف بني سهيلا الحكومي		
200	مؤسسات دولية+ مؤسسات مجتمع محلي	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	الدائرة الفنية-قسم التنظيم			✓			200		200	SO\1.3.1.4	إنشاء عيادة تخصصية نساء وولادة		
10	مؤسسات دولية+ مؤسسات مجتمع محلي	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	دائرة الصحة و البيئة+ لجنة المرأة			✓			10		10	SO\1.3.2.1	تدريب وتوعية صحية	SO\1. 3.2	زيادة دعم الوعي الصحي لدى المواطن
15	مؤسسات دولية+ مؤسسات مجتمع محلي	-	-	إداري و فني	وزارة الصحة	دائرة الصحة و البيئة+ لجنة المرأة			✓			15		15	SO\1.3.2.2	تنظيم حملات إرشاد نفسي		
90	الغرفة التجارية	خدمات حضرية و تثقيفية	10	إداري +فني	وزارة شؤون المرأة	لجنة المرأة			✓		100			100	SO\2.1.1.1	دعم المرأة الريفية	SO\2. 1.1	تفعيل دور المرأة في المجتمع



20	أطباء العالم فرنسا الأرومتوس طي	خدمات حضرية و تثقيفية	10	فني +إداري	نقابة المحامين	لجنة المرأة	✓		20	10			30	SO\2.1.1.2	حملات توعية المرأة حقوقياً وعلمياً ومعرفياً		
25	المؤسسات الدولية	خدمات حضرية و تثقيفية	-	-	-	قسم الحرف+ لجنة المرأة	✓		25			25	SO\2.1.1.3	إنشاء وحدة لتنمية العمل النسوي الحرفي في النادي النسوي			
40	+مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	-	-	دائرة العلاقات العامة	✓		40			40	SO\2.1.2.1	توريد وتوزيع مقاعد كهربائية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة	SO\2.1.2	دعم ذوي الاحتياجات الخاصة	
200	GIZ WB	-	-	-	-	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓	100	100			200	SO\2.1.2.2	تأهيل المرافق العامة في بني سهيلا لذوي الاحتياجات الخاصة			
200	مؤسسات دولية+ مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	شعبة الحرف + لجنة الشباب و الرياضة	✓		200			200	SO\2.1.3.1	إنشاء مركز شبابي متكامل	SO\2.1.3	دعم الشباب	
20	مؤسسة دولية	5	بلدية بني سهيلا	-	-	دائرة العلاقات العامة	✓	6.25	6.25	6.25	6.25	25	SO\2.1.3.2	تطوير قدرات إذاعة البلدية الالكترونية			



50	مؤسسات دولية+ مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	شعبة الحرف	✓				50	50	SO\2.1.3.3	تطوير وتجهيز المركز الشبابي التنسيقي لبلدية بني سهيلا		
20	مؤسسات دولية+ مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	شعبة الحرف	✓				20	20	SO\2.1.3.4	دعم المعارض الشبابية الحرفية.		
150	مؤسسات دولية+ مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	شعبة الحرف	✓				150	150	SO\2.2.1.1	إنشاء مكتبة عامة	SO\2.2.1	احتضان العمل الروائي والثقافي للنشأ
40	UNECIF	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	-	✓			40		40	SO\2.2.1.2	تعزيز العمل الروائي والتكنولوجي لدى طلاب الثانوية (دعم لمبادرات-إطلاق المسابقات)		
200	UNECIF مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	-	✓				200	200	SO\2.2.2.1	نشر كتاب بني سهيلا تراث وأنساب	SO\2.2.2	تطوير الجانب الثقافي والتراثي لبلدة بني سهيلا
100	UNECIF مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	إداري +فني	وزارة التربية و التعليم	-	✓				100	100	SO\2.2.2.2	دعم المنتجات التراثية التقليدية (ألبة - إكسوارات-أدوات منزلية-أثاث تقليدي).		



25	مؤسسات المجتمع المحلي + وزارة الثقافة و التراث	15	خدمات حضارية و ثقافية	إداري +فني	وزارة الثقافة و التراث	دائرة العلاقات العامة	✓			10	10	10	10	40	SO\3.1.1.1	التنظيم للأيام الوطنية والمعزة للتراث.	SO\3.1.1	إحياء الأيام الوطنية والتراثية
85	مؤسسات المجتمع المحلي + وزارة الثقافة و التراث	15	خدمات حضارية و ثقافية	إداري +فني	وزارة الثقافة و التراث	دائرة العلاقات العامة	✓			100				100	SO\3.1.1.2	إطلاق حملات البحث عن الآثار والتراث بين المواطنين.		
200	مؤسسات المجتمع المحلي + وزارة الثقافة و التراث	-	-	إداري +فني	وزارة الثقافة و التراث	دائرة العلاقات العامة	✓			200				200	SO\3.1.2.1	إنشاء متحف ومعرض للمقتنيات الأثرية	SO\3.1.2	حفظ المقتنيات الفلسطينية في المنطقة
250	مؤسسات المجتمع المحلي + وزارة الثقافة و التراث	-	-	إداري +فني	وزارة الإسكان و الإشغال العامة	دائرة العلاقات العامة	✓			250				250	SO\3.1.2.1	تعزيز استخدام نظام المجاورة السكنية	SO\3.1.2	تحسين جودة السكن



270	-الصندوق الكويتي -المنحة القطرية - بنك التنمية الاسلامي UN-	30	مصاريف الأشغال العامة	إداري+ فني	وزارة الأشغال و الاسكان العامة	الدائرة الفنية-قسم التنظيم	✓			75	75	75	75	300	SO\3.1.2.2	استكمال ملف الإعمار 2014 للمنازل المهدومة من الاعتداءات الصهيونية.		
500	مؤسسات دولية	-	-	إداري+ فني	وزارة الأشغال و الاسكان العامة	الدائرة الفنية	✓			500				500	SO\3.1.2.3	إنهاء وجود بيوت الأسبستوس في بني سهيلا		
150	مؤسسات دولية	-	-	إداري+ فني	وزارة الأشغال و الاسكان العامة	الدائرة الفنية	✓			150				150	SO\3.3.1.1	إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية - حكومي	SO\3. 3.1	توفير الخدمات الاجتماعية في البلدة
										626.25	1101 .25	1071 .25	1646. 25	11555	المجموع الجزئي			



الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			الجهة المرشحة للتنفيذ				تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			خطة 2018-2021				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم البرنامج	اسم البرنامج	المجال التعموي
غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	متمنى	محتمل	مضمون	الصرف السنوي									
قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	اسم الجهة	حدد القسم المعنى				الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة						
200	مؤسسات دولية	-	-	إداري+ فني	وزارة الأشغال و الاسكان العامة	الدائرة الفنية	✓				200				200	EC\1.1.1.1	إنشاء مركز مهني.		
100	مؤسسات دولية	-	-	إداري+ فني	وزارة الأشغال و الاسكان العامة	الدائرة الفنية	✓				100				100	EC\1.1.1.2	إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة		
200	UNDP الإغاثة الكاثوليكية وزارة العمل الإغاثة الإسلامية	20	التخطيط و تطوير المجتمع	-	-	بلدية بني سهيلا		✓			50	50	50	50	200	EC\1.1.1.3	تطوير قدرات] خريجين-عمال مهنيين [EC\1.1 .1	توفير فرص عمل للخريجين والعمال.
30	وزارة العمل الإغاثة الإسلامية	20	التخطيط و تطوير المجتمع	-	-	دائرة العلاقات العامة- قسم قلم الجمهور- الدائرة الادارية و المالية- قسم الحرف		✓			12.5	12.5	12.5	12.5	50	EC\1.1.1.4	تطوير قاعدة بيانات بعمال ومهنيين البلدة.		



35	اللجنة القطرية لإعادة الإعمار	-	-	إداري +فني	وزارة النقل و المواصلات	الدائرة الفنية				✓			35		35	70	EC\1.2.1.1	تطوير مواصفات للسيارات	EC\1.2 .1	توفير مرافق الخدمات العامة
35	MDLF																			
15	اللجنة القطرية لإعادة الإعمار MDLF	5	مصاريف الإشراف العامة	إداري +فني	وزارة النقل و المواصلات	الدائرة الفنية				✓			10		10	20	EC\1.2.1.2	إنشاء مظلات انتظار		
800	مؤسسات دولية	-	-	إداري +فني	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية-				✓			800			800	EC\1.2.2.1	إنشاء مدينة ألعاب تخدم المنطقة الشرقية	EC\1.2 .2	زيادة الأماكن الترفيهية والسياحية
400	مؤسسات دولية	-	-	إداري +فني	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية				✓			400			400	EC\1.2.2.2	زيادة عدد المنتجعات والشاليهات		
50	MDLF	-	-	إداري +فني	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية-قسم المشاريع				✓			25	25		50	EC\2.1.1.1	تطوير السوق الشعبي	EC\2.1 .1	زيادة الاستثمار التجاري
250	مؤسسات دولية	-	-	إداري +فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية				✓			250			250	EC\2.1.1.2	إنشاء سوق مركزي للجملة.		



1000	مؤسسات دولية	-	-	إداري + فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓				1000	1000	EC\2.1.1.3	إنشاء مركز تجاري			
300	مؤسسات دولية	-	-	إداري + فني	مؤسسات دولية	الدائرة الفنية-قسم المشاريع	✓				300	300	EC\2.1.1.4	تأهيل مقر البلدية القديم تأجير مكاتب "عمارة بلدية بني سهيلا".			
200	مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	-	-	قسم الحرف	✓				200	200	EC\2.2.1.1	فتح مكاتب خدمتية (تاكسيات، سياحة وسفر... الخ)			
60	مؤسسات المجتمع المحلي بكدار	-	-	-	-	قسم الحرف		✓		20	20	20	60	EC\2.2.1.2	إنشاء مخبز آلي في المناطق المهمشة	EC\2.2.1	تحسين الخدمات الزراعية
200	مؤسسات المجتمع المحلي	-	-	-	-	قسم الحرف	✓				200	200	EC\2.2.1.3	إنشاء محلات الوجبات السريعة			
100	مؤسسات دولية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				100	100	EC\3.1.1.1	تنفيذ مشروع انشاء دفيئات زراعية	EC\3.1.1	زيادة المنتج الزراعي	



200	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				200	200	EC\3.1.1.2	استصلاح أراضي بأشجار مثمرة			
100	CHF ACF أنيرا	-	-	-	-	الدائرة الفنية - قسم المياه		✓		50	50		100	EC\3.1.1.3	تمديد خطوط مياه ناقلة للمناطق الزراعية		
300	CHF ACF أنيرا	-	-	-	-	الدائرة الفنية - قسم المياه	✓				300	300	EC\3.1.2.1	توريد وتركيب شبكات ري			
50	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				50	50	EC\3.1.2.2	إنشاء خزان مياه للزراعة سعة 10 كوب.			
20	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				20	20	EC\3.1.2.3	توعية وارشاد للمزارعين (أفضل جودة بأقل تكلفة)	EC\3.1.2	دعم المزارعين	
30	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓				30	30	EC\3.1.2.4	توريد أسمدة وبذور			
40	CHF ACF أنيرا	-	-	-	-	الدائرة الفنية - قسم المياه	✓				40	40	EC\3.1.2.5	تسييج أراضي زراعية			



200	الإغاثة الزراعية مؤسسة ببادر	-	-	-	-	الدائرة الفنية	✓			100		100		200	EC\3.1.2.6	شق و تأهيل طرق زراعية		
500	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية- دائرة الصحة و البيئة	✓			500			500	EC\3.1.3.1	إنشاء مسلخ للدواجن	EC\3.1.3	الاستثمار في القطاع الزراعي	
600	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية- دائرة الصحة و البيئة	✓			600			600	EC\3.1.3.2	إنشاء مزرعة لبيع الماشية			
80	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم المياه	✓			80			80	EC\3.1.4.1	إنشاء برك تجميع لمياه الأمطار للمزارعين عدد 2 سعة 15 كوب للوحدة	EC\3.1.4	زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة	
150	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم المياه	✓			150			150	EC\3.1.4.2	إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار و من مجاري الأودية.			
100	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم المياه	✓			100			100	EC\3.1.4.3	توريد عدادات مياه للمزارعين			



600	مؤسسات دولية مؤسسات مجتمعية	-	-	-	-	الدائرة الفنية + الصحة و البيئة	✓			600	600	EC\3.2.1.1	انشاء مصنع للصناعات الغذائية.	EC\3.2.1	تحسين الاستثمار الصناعي	
1000	UNDP MDFL بكدار	300	بلدية بني سهيلا	إداري +فني	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية	✓		700		300	1000	EC\3.2.1.2			التأسيس للمدينة الصناعية للمنطقة الشرقية
600	UNDP MDFL بكدار	300	بلدية بني سهيلا	إداري +فني	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية	✓			600	600	EC\3.2.1.3	إنشاء مصنع تعليب خضار			
										932.5	202.5	207.5	407.5	8570	المجموع الجزئي	
										11283.5				المجموع الكلي (محتمل + مضمون) - دولار أمريكي		
										21453.5				المجموع الكلي (متمناة) - دولار أمريكي		
										32737				المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل + مضمون + متمنى) - دولار أمريكي		

7.2. خطة التنفيذ السنوية

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه	
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي				التكلفة التقديرية X \$1000				
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
بنود مرجعية	5	MDLF	-	-	-	-	الدائرة الفنية +الشؤون الإدارية و المالية				5	5	GOI.1.1.1	بناء نظام محوسب لإدارة الصيانة والتشغيل.	العمل البلدي حوسبة GO.1.1.1
بنود مرجعية	10	MDLF	5	تدريب و تطوير الموظفين	-	-	الشؤون الإدارية و المالية		5	5	5	15	GOI.1.2.1	بناء قدرات الكادر البلدي.	تحسين و تطوير العمل الإداري في البلدية GO.1.1.2
وثائق عطاء	80	MDLF	20	مصاريف ادارية-أثاث و تحسينات	-	-	الدائرة الفنية +الدائرة الادارية و المالية	5	5	5	110	125	GOI.1.2.3	استكمال و تأثيث مبنى البلدية	تحسين العمل الإداري في البلدية GO.1.1.3
بنود مرجعية	-	-	10	مصاريف صيانة+ مصاريف الأشغال العامة	-	-		8	8	5	4	25	GOI.1.3.1	رفع كفاءة معدات وآليات البلدية، وصيانتها	تحسين الخدمة المقدمة للجمهور GO.1.1.3
بنود مرجعية	20	مصلحة مياه بلديات الساحل	5	مصاريف الأمن و الإطفاء + إزالة مياه الأمطار	امداد آليات	المصلحة /لجنة الطوارئ	الدائرة الادارية و المالية	8	5	5	8	25	GOI.1.1.1	توريد عدد وأدوات لزوم إدارة الكوارث والطوارئ	توريد آليات و معدات لإدارة الكوارث و الطوارئ GO.2.1.1



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
بنود مرجعية	-	-	6.25	مصاريف خدمات	اداري + اعتماد	وزارة الحكم المحلي - الوحدة المركزية	الدائرة الفنية - قسم التنظيم	3.25	3			6.25	GO3.1.1.2	إعداد مشاريع إقراض	GO.3.1.1 تطوير المخططات التفصيلية للبلدة، و القضاء على العشوائية
بنود مرجعية	-	-	2.25	مصاريف خدمات	اداري + اعتماد	وزارة الحكم المحلي - الوحدة المركزية	الدائرة الفنية - قسم التنظيم	1.5	1			2.5	GO3.1.1.3	توعية المجتمع المحلي بأهمية تنفيذ مشاريع الإقراض	
وثائق عطاء	البنك الإسلامي للتنمية IDB	-	-	-	تشغيل خريج ن JPC	UNDP	الدائرة الفنية		20	20	20	60	GO3.2.1.1	ترقيم المباني و تسمية الشوارع على الطبيعة و المخططات و ربطها GIS	GO.3.2.1 تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS
								25.75	47	40	152	263.75		المجموع الجزئي	
بنود مرجعية	1.5	WB MDFL	1	أنشطة تثقيفية و توعوية و مجتمعية	-	-	الدائرة الفنية +	1.5	1			2.5	EI.1.1.1.1	حملات ترشيد الاستهلاك عبر الإذاعة و ضبط الاستهلاك غير القانوني.	EI.1.1.1 توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك مع ضبط القانوني للكهرباء



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/ المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه	
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		الصرف الربع سنوي							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
وثائق عطاء	1,735	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	إداري	وزارة الحكم المحلي	الدائرة الفنية	360	360	360	665	1735	EI.2.1.1.1	تطوير شارع الشهداء المرحلة الأولى	EI.2.1.1 تطوير و تخطيط شوارع متفرقة	
مقترحات + وثائق عطاء	50	صندوق البلديات MDLF	-	-	إداري	صندوق البلديات MDLF	الدائرة الفنية			25	25	50	EI.2.1.1.2	رصف و تخطيط شوارع داخلية		
مقترحات + وثائق عطاء	300	صندوق البلديات MDLF	-	-	إداري	صندوق البلديات MDLF	الدائرة الفنية			100	200	300	EI.2.1.1.3	تطوير و تخطيط شوارع بطول 30 كم.		
مقترحات + وثائق عطاء	700	صندوق البلديات MDLF	-	-	إداري	صندوق البلديات MDLF	الدائرة الفنية			25	25	50	EI.2.1.2.1	تأهيل و صيانة شوارع معبدة	EI.2.1.2 تأهيل و صيانة شوارع معبدة	
وثائق عطاء	40	MDFL	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم الصيانة	10	10	10	20	40	EI.2.1.2.1	توريد مواد صيانة طرق و بنية تحتية و مباني		



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
مقترحات	2.5	-	2.5	تكلفة خدمة المياه	-	-	قسم المياه	1.5	1			2.5	Ei.3.1.1.1	استبدال العدادات المنزلية العطلانة	Ei.3.1.1 زيادة مصادر المياه و الحفاظ عليه
مقترحات + وثائق عطاء	35	أنيرا	-	-	-	-	قسم المياه			18	20	50	Ei.3.1.1.2	صيانة شبكة المياه القائمة	
مقترحات	-	-	5	الصرف الصحي	-	-	قسم الصحة و البيئة				5	5	Ei.3.2.1.2	صيانة سيارات كسح آبار الصرف الصحي	Ei.3.2.1 تحسين قدرات البلدية في كسح آبار الصرف الصحي
وثائق عطاء	10	مؤسسات دولية	20	الصرف الصحي	إداري	مصلحة مياه بلديات الساحل	قسم الصحة و البيئة	15	15	-	-	30	Ei.3.2.1.7	صيانة شبكة الصرف الصحي القائمة	Ei.3.2.2
مقترحات	-	-	-	خدمات حضارية و ثقافية-صيانة حدائق و منتزهات	-	-	الدائرة الفنية	15	10			25	Ei.4.1.1.3	تشجير شوارع البلدة	Ei.4.1.1 انشاء المرافق الداعمة للصحة العامة
وثائق عطاء	20	MDLF	-	-	-	-	دائرة البيئة و الصحة العامة	20				20	Ei.4.2.1.1	توريد حاويات حديد بسعة 1 كوب	Ei.4.2.1 تحسين مستوى نظافة البلدة
								438	397	538	955	2320		المجموع الجزئي	



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه	
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		الصرف الربع سنوي							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
وثائق عطاء	1250	وزارة التربية و التعليم	50	شراء أراضي	تنفيذ + إداري	وزارة التربية و التعليم	الدائرة - الفنية - قسم التنظيم			625	625	1250	SO1.1.1.2	إنشاء مدرسة أساسية عدد 2 حكومة	SO1.1.2.1 تحسين جودة التعليم كما نوعاً.	
بنود مرجعية	45	USAID	5	مصاريف خدمات	-	-	-	15	15	10		50	SO1.2.2.1	دعم أندية و صالات القطاع الخاص	SO1.2.2 تطوير الأندية الرياضية	
مقترحات	80	وزارة الرياضة و الشباب	20	خدمات حضارية و ثقافية - النشاطات الرياضية	-	-	دائرة العلاقات و العامة و الإعلام - اللجنة الرياضية	35	35	30		100	SO1.2.2.2	تطوير الملاعب الخماسية في المدينة		
بنود مرجعية	20	وزارة الرياضة و الشباب	5	مصاريف ادارية - مصاريف فرق رياضية للهيئة المحلية	-	-	دائرة العلاقات و العامة و الإعلام - اللجنة الرياضية	10	5	5	5	25	SO1.2.2.3	الاهتمام في الفرق الرياضية		
وثائق عطاء	300	مؤسسة التعاون	-	-	تبرع بالأرض	المجتمع المحلي	الدائرة - الفنية - قسم التنظيم			65	65	130	SO1.3.1.2	إنشاء مجمع طبي	SO1.3.1 الارتقاء بالخدمات الصحية	
بنود مرجعية	2	وزارة الحكم المحلي		مصاريف اتصالات	-	-	دائرة العلاقات و العامة و الإعلام		2.25	2	2	6.25	SO2.1.3.2	تطوير قدرات إذاعة البلدية الإلكترونية	SO2.1.3 دعم الشباب	



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	حددها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
مقترحات	-	-	10	خدمات حضرية و ثقافية	-	-	دائرة العلاقات والعامه و الإعلام + الشؤون الإدارية و المالية	2	3	2	3	10	SO2.1.3.1.1	التنظيم للأيام الوطنية و المعزة للتراث	SO3.1.1
بنود مرجعية	100	وزارة الأشغال و الإسكان العامه	-	-	-	-	الدائرة الفنية- قسم التنظيم	25	25	25		75	SO3.2.1.2	استكمال ملف الإعمار 2014 للمنازل المهذومة من الاعتداءات الصهيونية	SO3.2.1 جودة السكن تحسين
								87	85.25	764	700	1646.25	المجموع الجزئي		
بنود مرجعية	45	وزارة العمل	5	التخطيط و تطوير المجتمع	-	-	بلدية بني سهيل	15	15	10	10	50	EC.1.1.3	تطوير قدرات [خريجين-عمال مهنيين]	EC.1.1.1 توفير فرص عمل للخريجين و العمال
بنود مرجعية	12.5	وزارة العمل	-	-	-	-	قسم الحرف		6	6.5		12.5	EC.1.1.4	تطوير قاعدة بيانات بعمال و مهنيين البلدة	عمل
وثائق عطاء	35	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	-	-	الدائرة الفنية	10	10	15		35	EC.1.2.1.1	تطوير مواقف للسيارات	EC.1.2.1 توفير مرافق الخدمات العامه



تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2018				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج و رقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
مقترحات	22	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	-	تبرع	المجتمع المحلي	الدائرة الفنية - دائرة العلاقات والعامه و الإعلام	5	5			10	EC.1.2.1.2	إنشاء مظلات انتظار	
مقترحات	-	-	200	مساهمة أراضي	-	-	الدائرة الفنية - قسم التنظيم	50	50	50	150	300	EC.1.1.4	التأسيس للمدينة الصناعية للمنطقة الشرقية	EC.3.2.1
								80	86	81.5	160	407.5	المجموع الجزئي		
								630.75	615.25	1423.5	1967	4636.5	مجموع الإنفاق الكلي للعام 2018		

7.3. خطة المتابعة والتقييم

الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
مجال البيئة والبنى التحتية										
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	برنامج إدارة الصيانة و التشغيل /الملاحظة	البلدية MDLF			60%	30%	10%	نسبة السجلات للأصول الثابتة	بناء نظام محوسب لإدارة الصيانة والتشغيل .	حوسبة العمل البلدي
الشؤون الإدارية و المالية	برنامج المنظومة الإلكترونية للبلدية-ملف التقرير الإداري	البلدية	40%	20%			نسبة الوثائق المؤرخة	بناء نظام محوسب لإدارة الوثائق		
الدائرة الفنية	برنامج المنظومة الإلكترونية للبلدية	البلدية	80%	60%	40%		نسبة ملفات الترخيص المحوسبة	بناء نظام محوسب لإدارة ملفات التنظيم والتراخيص .		
الشؤون الإدارية و المالية	كشوف الحضور للدورات و ورش العمل عقود المدربين	البلدية			25	10	5	عدد الدورات التدريبية	بناء قدرات الكادر البلدي .	تحسين وتطوير العمل الإداري في البلدية
الشؤون الإدارية و المالية	فواتير الشراء العطاء تقارير إيداع مخازن	البلدية	130	110			90	عدد قطع المعدات المكتنية	تحديث وتوريد أجهزة ومعدات مكتنية	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	تقارير إيداع مخازن عطاء	مؤسسات دولية				100%	40%	تجهيز مساحة الطابق الثاني للمبنى بمساحة 2600م	استكمال و تأثيث مبنى البلدية	
قسم الآيات	فواتير	البلدية	70%	60%	50%	40%	30%	نسبة كفاءة آليات البلدية	رفع كفاءة معدات وآليات البلدية، وصيانتها	تحسين الخدمة المقدمة للجمهور
قسم الآيات	فواتير	البلدية		100%			20%	إنشاء بناء مساحة 400م 2	إنشاء كراج للبلدية	
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد	توريد بوب كات	توريد آليات ومعدات لإدارة الكوارث والطوارئ
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد	توريد كونجو	



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/ المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
قسم الآيات	فواتير	البلدية	1				0	عدد	توريد حفار.	
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد	توريد شاحنة صغيرة	
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد	توريد سيارة.	
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد	توريد كباش.	
قسم الآيات	فواتير	البلدية مؤسسات دولية	60%	45%	25%	10%	20	نسبة	توريد عدد وأدوات لزوم إدارة الكوارث والطوارئ	
الدائرة المالية و الشؤون الإدارية	مخططات المنطقة المستهدفة شهادات المتطوعين و عقود العاملين الصور /تقارير	البلدية مؤسسات دولية	4	3	2		1	عدد حملات التوعية التي ستطلق	توعية للمجتمع المحلي بمجال إدارة الطوارئ والكوارث	تأهيل وتطوير قدرات المجتمع المحلي
الدائرة الفنية و الشؤون الإدارية	صور تقارير ملف تنظيمي ملكية الأرض	البلدية مؤسسات دولية	1				0	عدد المراكز	إنشاء وتجهيز مركز للدفاع المدني.	تطوير قدرات الدفاع المدني
الدائرة الفنية	صور تقارير ملف تنظيمي	البلدية مؤسسات دولية	4	2			0	عدد نقاط تزويد المياه	توريد وتركيب نقاط لتزويد المياه للدفاع المدني.	
الدائرة الفنية و الشؤون الإدارية	تقارير/ ملف تنظيمي ملكية الأرض	البلدية مؤسسات دولية	95%	60%	40%		0%	نسبة انجاز و تجهيز	إنشاء وتجهيز مركز للشرطة	تعزيز قدرات الخدمات الشرطية
الدائرة الفنية	ملفات تنظيم مخطط مصادق من الوحدة المركزية	البلدية وزارة الحكم المحلي - الوحدة المركزية	2				0	عدد المناطق الموسعة المعمول لها إفران مساحي	استكمال المخططات التفصيلية للمناطق التي تم توسعتها بعد 2009-2014.	تطوير المخططات التفصيلية للبلدة، والقضاء على العشوائية



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	ملفات تنظيم مخطط مصادق من الوحدة المركزية	البلدية الوحدة المركزية	70%	60%	45%	30%	10%	نسبة الأراضي التي خضعت لمشاريع الإفراز في البلدية	إعداد مشاريع إفراز	
الدائرة الفنية	ملفات تنظيم مخطط مصادق من الوحدة المركزية	البلدية الوحدة المركزية	60%	50%	40%	30%	20%	نسبة المواطنين الذين تم توعيتهم	توعية المجتمع المحلي بأهمية تنفيذ مشاريع الإفراز	
الدائرة الفنية	ملفات تنظيم مخطط مصادق من الوحدة المركزية	البلدية الوحدة المركزية	3				2	عدد المناطق التي لها مخطط هيكلي مصادق عليه	تحديث المخطط الهيكلي للبلدة.	تحديث و تطوير المخطط الهيكلي للبلدة
الدائرة الفنية	فاتورة	مؤسسات دولية			1		0	عدد	توفير صورة جوية حديثة لنفوذ البلدة.	
الدائرة الفنية	كشوفات الحضور للخريجين لوحات التسمية على الشوارع	مؤسسات دولية البلدية				100%	40%	نسبة الانجاز	ترقيم المباني وتسمية الشوارع على الطبيعة و مخططات، وربطها GIS.	تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS
الدائرة الفنية	فاتورة	مؤسسات دولية البلدية		1			0	عدد	توريد أجهزة الرفع المساحي GPS	توريد معدات و أجهزة لزوم الرفع المساحي لمناطق النفوذ
الدائرة الفنية	فاتورة	مؤسسات دولية البلدية		1			0	عدد	توريد جهاز Total station	
الدائرة الفنية	فاتورة	مؤسسات دولية البلدية		1			0	عدد	توريد أجهزة Tablets عدد 10	
البيئة و البنية التحتية										
الدائرة الفنية	ملف الصوتيات	مؤسسات دولية البلدية	4	3	2	1	0	عدد	حملات ترشيد الاستهلاك عبر الإذاعة و ضبط الاستهلاك غير القانوني	توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك للكهرباء مع الضبط القانوني



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	أبروشور	مؤسسات دولية البلدية		2	1		0	عدد	تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في المنازل.	
الدائرة الفنية	عطاء /ملاحظة/سند مخازن	مؤسسات دولية البلدية	50	25			0	عدد الفوانيس الموفرة للطاقة التي يتم توحيدها	توريد فوانيس إنارة شوارع موفرة للطاقة	تحسين شبكة الإنارة في البلدة
الدائرة الفنية والشؤون الإدارية و المالية	سند مخازن تقرير صيانة/ملاحظة	البلدية شبكة الكهرباء	80%	60%	45%	30%	30%	نسبة المواد الموفرة للطاقة التي يتم توحيدها بالنسبة لاحتياجات المنطقة.	صيانة شبكة الإنارة في البلدة	
الدائرة الفنية	تقارير	البلدية	2				0	عدد المناطق المنارة من ميادين البلدة بالطاقة الشمسية	إنارة ميادين البلدة الرئيسية باستخدام الخلايا الشمسية	استخدام الطاقة الشمسية و البديلة
الشؤون الإدارية و المالية	مقترح مشروع/ تقارير	البلدية		1			0	عدد مشاريع التشغيل في البلدية باستخدام مصادر الطاقة البديلة	تشغيل نظم التبريد و التسخين في البلدية باستخدام مصادر الطاقة البديلة	
قسم المياه	سجلات و فواتير شركة الكهرباء عن انخفاض الاستهلاك من الكهرباء	البلدية شركة الكهرباء		3	1		0	عدد الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية	تشغيل الآبار الصغيرة المزودة للبلدية بمصادر المياه بالطاقة الشمسية	
الدائرة الفنية	تقارير	البلدية شركة الاتصالات	70%	60%			50%	نسبة الخطوط و توسعة الشبكة	توسعة شبكة الهواتف الأرضية و المحمول	توفير خدمات الاتصال السلكي واللاسلكي
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي				1600م	200م	طول الشارع المرحلة الأولى المراد تطويره	تطوير شارع الشهداء (المرحلة الأولى)	تطوير و تبليط شوارع متفرقة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000م	مساحة تبليط الشوارع	رصف و تبليط شوارع داخلية	



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي	300.000	250.000	200.000	150.000	م100.0002	طول 30كم	تطوير و تلبيط شوارع بطول 30 كم	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي	300.000	250.000	200.000	150.000	م100.0002	مساحة تلبيط الشوارع	تأهيل و صيانة شوارع معدة بواقع 100.000م2	إعادة تأهيل و صيانة شوارع معدة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي	300.000	250.000	200.000	150.000	م100.0002	مساحة تلبيط الشوارع	توريد مواد صيانة طرق و بنية تحتية و مباني	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي مؤسسات مجتمع محلي	100%				%0	نسبة الإنجاز	إنشاء و تهيئة الأرصفة و دهان ممرات المشاة و المداخل	تحسين السلامة المرورية
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي مؤسسات مجتمع محلي			100%		%0	نسبة الإنجاز	وضع اشارات مرور ارشادية	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الحكم المحلي مؤسسات مجتمع محلي	2000	1500	1000	500	0	عدد العدادات العطلانة	استبدال العدادات المنزلية (العطلانة)	زيادة مصادر المياه و الحفاظ عليها



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل	40	38	35	33	30	طول (كم)	صيانة شبكة المياه القائمة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل	3	1	1		3	عدد	إنشاء آبار مياه جديدة عدد 3	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل	4	3			2	عدد	إنشاء خزان مياه عدد 2	
الدائرة الفنية	كشف الزيارات الملف الصوتي عبر الإذاعة فاتورة الحملة الأبروشور	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل			1		0	عدد الحملات	حملات توعية لترشيد استهلاك المياه	توعية المواطن بترشيد استهلاك المياه
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل					0	عدد المحطات المراد صيانتها	صيانة محطات التحلية القائمة	تحسين جودة المياه
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل	3	2			1	عدد	إنشاء محطات تحليه صغيرة عدد2 بالقرب من المدارس بطاقة إنتاجية 25 كوب يومياً.	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة الساحل	4	3			2	عدد	توريد مضخات	تحسين قدرات البلدية في كسح آبار الصرف الصحي



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF		1	1	1	0	عدد	صيانة سيارة كسح آبار الصرف الصحي	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF	0	1	0	0	0	عدد	توريد البينات لكسح آبار الصرف الصحي (جتر + سيارة كسح)	تحسين شبكة الصرف الصحي
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF	0	1	0	0	1	عدد	إنشاء محطة ضخ رقم 4	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF	0	10	0	0	0	كم	إنشاء الخط الناقل من صوفا إلى محطة رقم 4	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF	0	1	0	0	1	عدد	إعادة تأهيل محطة ضخ رقم 5	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	0	6	0	0	0	كم	إنشاء الخط الناقل من محطة رقم 4 إلى محطة رقم 5	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	0	6	0	0	0	كم	توسعة شبكة الصرف الصحي للمناطق غير المغطاة	



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	30	20	10	5	0	كم	صيانة شبكة الصرف الصحي القائمة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	تأهيل وادي أبو نصير	الاستفادة من مياه الأمطار
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	تأهيل واد ارميضة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	تأهيل وادي القرا	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	تأهيل وادي أبو الحصو	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية المصلحة	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	تأهيل وادي أبو هجرس	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	100%	60%	40%		0%	نسبة انجاز	حقن مياه الأمطار	



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	4				2	عدد	إنشاء برك تجميع لمياه الأمطار للمزارعين	دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مصلحة بلديات الساحل	1000	500			1000	م	إنشاء شبكة توزيع مياه أطمار و من مجاري الأودية.	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		100%	50%			نسبة انجاز	إنشاء منتره بلدي	إنشاء المرافق الداعمة للصحة العامة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		100%	50%			نسبة انجاز	إنشاء حديقة في منطقة الزينة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		100%	%75	50%	25%	نسبة انجاز	تشجير شوارع البلدة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1			0	عدد	توفير جهاز فوكر كبير و مواد رش الباعوض و مواد لمكافحة القوارض	توريد أليات ومعدات
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF		1			0	عدد	توريد بوب كات	



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية MDLF				30	0	عدد	توريد حاويات حديد بسعة 1 كوب	تحسين مستوى نظافة البلدة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		500			0	عدد	توريد حاويات بلاستيكية سعة 60 لتر و أدوات نظافة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	1				1	عدد	توريد كمباكتر صغير سعة 3 كوب.	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1			0	عدد	توريد كباش صغير بقوة لا تقل عن 120 حصان	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	100	50			0	عدد	تشغيل عمال نظافة و كارات لجمع و النفايات المنزلية من بيت لبيت.	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1			0	عدد	توفير أرض كمحطة ترحيل	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1			0	عدد	توريد سيارة ترحيل نفايات صلبة قدرة 18 طن	



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	%80	%40			%10	نسبة الانجاز	توعية المجتمع المحلي صحياً وبيئياً	تعزيز الإرشاد الصحي والبيئي
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1			0	عدد	إنشاء و تجهيز مركز التثقيف الصحي داخل دائرة الصحة و البيئة	
مجال التنمية الاجتماعية										
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة التربية و التعليم	1	0	0	0	1	عدد	إنشاء مدرسة ثانوية	تحسين جودة التعليم كما ونوعاً
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة التربية و التعليم	2	2	1	1	2	عدد	إنشاء مدرسة حكومية عدد (2)	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة التربية و التعليم	1	0	0	0	1	عدد	إنشاء عدد 1 مدرسة وكالة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة التربية و التعليم	4	2	1	0	4	عدد	تأهيل وتطوير المدارس الحالية	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة العمل النقابات العمالية	1	0	0	0	1	عدد	انشاء مدرسة صناعية ومهنية	



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	1	0	0	0	1	عدد	إنشاء ملعب بلدي مركزي	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة المرأة	1	0	0	0	1	عدد	إنشاء نادي نسوي	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	1	0	0	0	1	عدد	إنشاء صالة مغلقة	تطوير الأندية الرياضية
الدائرة الإدارية و الشؤون المالية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	4	3	2	1	4	عدد	دعم أندية وصلات القطاع الخاص	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	2	2	1	1	2	عدد	تطوير الملاعب الخماسية في المدينة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	70%	60%	50%	40%	20%	نسبة	الاهتمام في الفرق الرياضية	الارتقاء بالخدمات الصحية
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	2	2	1	1	2	عدد	إنشاء عيادات تخصصية	



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الصحة مؤسسات دولية	0	0	1	1	1	عدد	إنشاء مجمع طبي	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الصحة مؤسسات دولية	80%	50%	30%	0	80%	نسبة	تطوير مستوصف بني سهيلا الحكومي	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الصحة مؤسسات دولية	1	1	0	0	1	عدد	إنشاء عيادة تخصصية نساء وولادة	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	كشوف الحضور للدورات و ورش العمل عقود المدربين	وزارة الصحة مؤسسات دولية	1	1	0	0	1	عدد	تدريب وتوعية صحية	زيادة دعم الوعي الصحي لدى المواطن
الشؤون الإدارية و المالية	كشوف الحضور للدورات و ورش العمل عقود المدربين	وزارة الصحة مؤسسات دولية	1	1	0	0	1	عدد	تنظيم حملات ارشاد نفسي	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	وزارة المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية	1	0	0	0	1	عدد	دعم المرأة الريفية	تفعيل دور المرأة في المجتمع



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
دائرة العلاقات العامة	كشف الزيارات الملف الصوتي عبر الإذاعة فاتورة الحملة الأبروشور	وزارة المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسات حقوقية	1	1	0	0	1	عدد	حملات توعية المرأة حقوقياً وعلمياً ومعرفياً	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة المرأة مؤسسات دولية	80%	60%	40%	30%	0.0%	نسبة	إنشاء وحدة لتنمية العمل النسوي الحرفي في النادي النسوي	
دائرة العلاقات العامة	كشف الزيارات الملف الصوتي عبر الإذاعة فاتورة الحملة الأبروشور	البلدية وزارة الشؤون الاجتماعية اتحاد لجان العمل الصحي	100	50	0	0	100	عدد	توريد وتوزيع مقاعد كهربائية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة	
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشؤون الاجتماعية اتحاد لجان العمل الصحي	5	2	0	0	5	عدد	تأهيل المرافق العامة في بني سهيلا لنوعي الاحتياجات الخاصة	دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة	1	1	1	0	1	عدد	إنشاء مركز شبابي متكامل	
دائرة العلاقات العامة و الإعلام	ملف الصوتيات مجلة الحصاد تقارير	البلدية مؤسسات دولية	95%	80%	70%	60%	50%	نسبة الانجاز	تطوير قدرات إذاعة البلدية الإلكترونية	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء والترسية على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة المرأة مؤسسات دولية	80%	60%	40%	30%	0.0%	نسبة الانجاز	تطوير وتجهيز المركز الشبابي التنسيقي لبلدية بني سهيلا	دعم الشباب



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة مؤسسات دولية	2	1	0	0	2	عدد	دعم المعارض الشبابية الحرفية.	
الشؤون الإدارية و المالية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الشباب و الرياضة مؤسسات دولية	1	1	0	0	1	عدد	إنشاء مكتبة عامة	
دائرة العلاقات العامة والإعلام	كشف حضور تقارير عرض CD	البلدية وزارة التربية و التعليم	1				1	عدد	تعزيز العمل الروائي والتكنولوجي لدى طلاب الثانوية (دعم لمبادرات-إطلاق المسابقات)	
دائرة العلاقات العامة والإعلام	كشف حضور تقارير عرض CD	البلدية وزارة التربية و التعليم	1				1	عدد	نشر وتوزيع كتاب بني سهيلا تراث وأنساب	احتضان العمل الروائي والثقافي للنشأ
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة والإعلام	ملاحظة/ تقارير/فواتير/بنود مرجعية	البلدية مؤسسات دولية	2	1	0	0	2	عدد	دعم المنتجات التراثية التقليدية (البسة -أكسسوارات-أدوات منزلية-أثاث تقليدي).	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة والإعلام	ملاحظة/ تقارير/بنود	البلدية مؤسسات مجتمع محلي مؤسسات دولية	4	3	2	1	4	عدد	التنظيم للأيام الوطنية والمعززة للتراث.	تطوير الجانب الثقافي والتراثي لبلدة بني سهيلا
دائرة العلاقات العامة والإعلام	ملاحظة/ تقارير/بنود مرجعية	البلدية مؤسسات مجتمع محلي مؤسسات دولية	1	1	0	0	0	عدد	إطلاق حملات البحث عن الأثار والتراث بين المواطنين.	



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
دائرة العلاقات العامة و الإعلام	ملاحظة/ تقارير/بنود مرجعية	البلدية مؤسسات مجتمع محلي مؤسسات دولية	1	1	0	0	0	عدد	انشاء متحف ومعرض للمقتنيات الأثرية	إحياء الأيام الوطنية والتراثية
دائرة العلاقات العامة و الإعلام الدائرة الفنية	ملاحظة/ تقارير/بنود مرجعية إذاعة صوتية	البلدية مؤسسات مجتمع محلي مؤسسات دولية	60%	50%	40%	30%	%0	نسبة	تعزيز استخدام نظام المجاورة السكنية	
الدائرة الفنية	تقارير/ ملاحظة/ كشوفات	البلدية مؤسسات اعادة الاعمار لجنة متابعة الإعمار	95%	90%	80%	75%	70%	نسبة الانجاز	استكمال ملف الاعمار 2014 للمنازل المهدومة من الاعتداءات الصهيونية.	حفظ المقتنيات الفلسطينية في المنطقة
الدائرة الفنية	تقارير/ ملاحظة/ كشوفات	البلدية مؤسسات اعادة الاعمار لجنة متابعة الإعمار	30%	40%	50%	60%	70%	نسبة الانجاز	إنهاء وجود بيوت الأسبستوس في بني سهيلا	تحسين جودة السكن
الدائرة الفنية	تقارير/ ملاحظة/ كشوفات	البلدية مؤسسات اعادة الاعمار لجنة متابعة الإعمار	1	1	0	0	0	عدد	إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية - حكومي	
مجال تنمية الاقتصاد المحلي										
الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية MDLF	1	0	0	0	0	عدد	إنشاء مركز مهني.	توفير فرص عمل للخريجين والعمال.



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية مؤسسات مجتمع محلي	1	0	0	0	0	عدد	إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة	
بلدية بني سهيلا	كشوفات حضور	البلدية مؤسسات دولية	40	30	20	10	40	عدد	تطوير قدرات [خريجين-عمال مهنيين]	
بلدية بني سهيلا	كشوفات/تقارير	البلدية مؤسسات دولية	40	30	20	10	40	عدد	تطوير قاعدة بيانات بعمال ومهنيين البلدة.	
بلدية بني سهيلا	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية		1		1	2	عدد	تطوير مواقف للسيارات	توفير مرافق الخدمات العامة
بلدية بني سهيلا	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات/صور	البلدية مؤسسات دولية		1		1	2	عدد	إنشاء مظلات انتظار	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	100%				0%	نسبة الانجاز	إنشاء مدينة ألعاب تخدم المنطقة الشرقية	زيادة الأماكن الترفيهية والسياحية
الشؤون الإدارية و المالية	كشوفات/تقارير/زيارات ميدانية	البلدية مؤسسات دولية	25%	15%			0%	نسبة عدد المنتجعات والشهاليه	زيادة عدد المنتجعات والشاليهات	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية			90%	80%	70%	نسبة الانجاز	تطوير السوق الشعبي	زيادة الاستثمار التجاري



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	70%	60%	50%	30%	0%	نسبة الانجاز	إنشاء سوق مركزي للجملة.	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	70%	60%	50%	30%	0%	نسبة الانجاز	إنشاء مركز تجاري	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية			95%	50%	30%	نسبة الانجاز	تأهيل مقر البلدية القديم تأجير مكاتب "عمارة بلدية بني سهيل".	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة و الإعلام	ملاحظة/ تقارير/فواتير/بنود مرجعية/رخصة حرفة	البلدية مجتمع محلي مؤسسات مجتمع محلي	2	1	0	0	2	عدد	فتح مكاتب خدمانية (تاكسيات، سياحة وسفر... الخ)	تحسين الخدمات المساندة
الشؤون الإدارية و المالية	ملاحظة/ تقارير / بنود مرجعية/رخصة حرفة	البلدية مجتمع محلي مؤسسات مجتمع محلي	2	1	0	0	2	عدد	إنشاء مخبز آلي في المناطق المهمشة	
دائرة العلاقات العامة و الإعلام	ملاحظة/ تقارير / بنود مرجعية/رخصة حرفة	البلدية مجتمع محلي مؤسسات مجتمع محلي	2	1	0	0	2	عدد	إنشاء محلات الوجبات السريعة	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة وزارة الشؤون الاجتماعية	1	0	0	0	1	عدد	تنفيذ مشروع انشاء دفيئات زراعية	زيادة المنتج الزراعي



الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	70%	60%	50%	45%	40%	نسبة الانجاز	استصلاح أراضي بأشجار مثمرة	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	70%	60%	50%	45%	40%	نسبة الانجاز	تمديد خطوط مياه ناقلة للمناطق الزراعية	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	50%	40%			20%	نسبة الانجاز	توريد وتركيب شبكات ري	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	0	1	0	0	1	عدد	إنشاء خزان مياه للزراعة سعة 10 كوب.	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	تقارير / ملاحظة/ كشوفات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	0	1	0	0	1	عدد	توعية وارشاد للمزارعين (أفضل جودة بأقل تكلفة)	دعم المزارعين
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	تقارير / ملاحظة/ كشوفات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	0	1	0	0	1	عدد	توريد أسمدة وبنور	
الشؤون الإدارية و المالية دائرة العلاقات العامة	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	5000	4000	3000	2000	1000	طول (م)	تسييج أراضي زراعية	



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	1500	1000	800	0	600	طول (م)	شق و تأهيل طرق زراعية	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	80%	40%	20%		0%	نسبة الانجاز	إنشاء مسلخ للدواجن	الاستثمار في القطاع الزراعي
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	95%	50%			0%	نسبة الانجاز	إنشاء مزرعة لبيع الماشية	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	0	1	0	0	1	عدد	انشاء برك تجميع لمياه الأمطار للمزارعين عدد 2 سعة 15 كوب للواحدة	زيادة كميات المياه الموجهة للزراعة
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	2000	1500	700		200	طول (م)	إنشاء شبكة توزيع مياه أمطار و من مجاري الأودية.	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	2000	1500	500		200	عدد	توريد عدادات مياه للمزارعين	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	80%	40%	20%		0%	نسبة الانجاز	انشاء مصنع للصناعات الغذائية.	تحسين الاستثمار الصناعي



الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر	أداة القياس	مصدر المعلومات	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرنامج
			الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى				
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية مؤسسات دولية	60%			20%	5%	نسبة الانجاز	التأسيس للمدينة الصناعية للمنطقة الشرقية	
الشؤون الإدارية و المالية الدائرة الفنية	وثائق العطاء وثيقة الإرساء على المقاول/ ملاحظة/ المستخلصات	البلدية وزارة الزراعة مؤسسات دولية	80%	40%	20%		0%	نسبة الانجاز	انشاء مصنع تعليب خضار	



8. الملاحق

8.1. التقرير التشخيصي

8.2. توصيف مكونات البرامج/مشاريع السنة الأولى
